

令和 3 年 9 月の月間報告について

幕張新都心廃棄物空気輸送システムごみ輸送管復旧業務委託における令和 3 年 9 月の進捗状況及び 10 月の作業予定について報告します。

1 9 月の進捗状況

復旧に先立って、以下のとおり作業を実施しました。工程表（9 月実績）は別紙のとおりです。

(1) 準備

ア 準備工（共同溝内）

- ・ごみ輸送管一部切断・閉塞蓋設置（作業状況写真 撮影項目 1～2）

イ 準備工（緑地帯）

- ・敷鉄板設置、現場事務所の設置（作業状況写真 撮影項目 3～4）

ウ 準備工（クリーンセンター・歩道部）

- ・既設共同溝の位置確認ボーリング調査（作業状況写真 撮影項目 5）

(2) 土留工

ア ヤード造成工（クリーンセンター・歩道部）

- ・ヤード造成・仮囲いの設置、緑地残土掘削搬出（作業状況写真 撮影項目 6～7）

2 10 月の作業予定

以下のとおり作業を予定しています。工程表（10 月予定）は別紙のとおりです。

(1) 土留工

ア ヤード造成工（クリーンセンター・歩道部）

- ・万能鋼板設置
- ・緑地残土掘削・搬出、既設擁壁撤去搬出
- ・場内、既設埋設物撤去移設工

イ ヤード造成工（隣接駐車場内）

- ・隣接駐車場内万能鋼板設置

ウ 立坑・共同溝構築工

- ・ピット部鋼矢板打設

以 上

【作業状況写真】

 <p>工事名 東京都心部下水道管線システムごみ輸送管管有日本郵船株式会社 工種 配管工 期 点 共同溝51-1 コールドカッター切断状況</p>	<p>撮影項目 1 令和3年9月度 履行報告 準備 準備工(共同溝内) ごみ輸送管一部切断 共同溝内φ500 既設管 切断状況 (※1)</p>
	<p>撮影項目 2 令和3年9月度 履行報告 準備 準備工(共同溝内) 閉塞蓋設置 設置状況 (※1)</p>



撮影項目 3
 令和3年9月度
 履行報告 準備
 準備工(緑地帯)
 事務所、資材ヤード造成
 敷鉄板設置完了
 (※2)



撮影項目 4
 令和3年9月度
 履行報告 準備
 準備工(緑地帯)
 事務所、資材ヤード造成
 敷鉄板設置完了
 (※2)




撮影項目 5
 令和3年9月度
 履行報告 土留工
 準備工(クリーンセンター・歩道部)
 共同溝位置確認ボーリング
 探査ボーリング状況
 (※3)



撮影項目 6
 令和3年9月度
 履行報告 土留工
 ヤード造成工(クリーンセンター・歩道部)
 緑地残土掘削搬出
 植樹部 残土掘削状況
 (※4)



撮影項目 7
 令和3年9月度
 履行報告 土留工
 ヤード造成工(クリーンセンター・歩道部)
 緑地残土掘削搬出
 植樹部 残土掘削状況
 (※4)

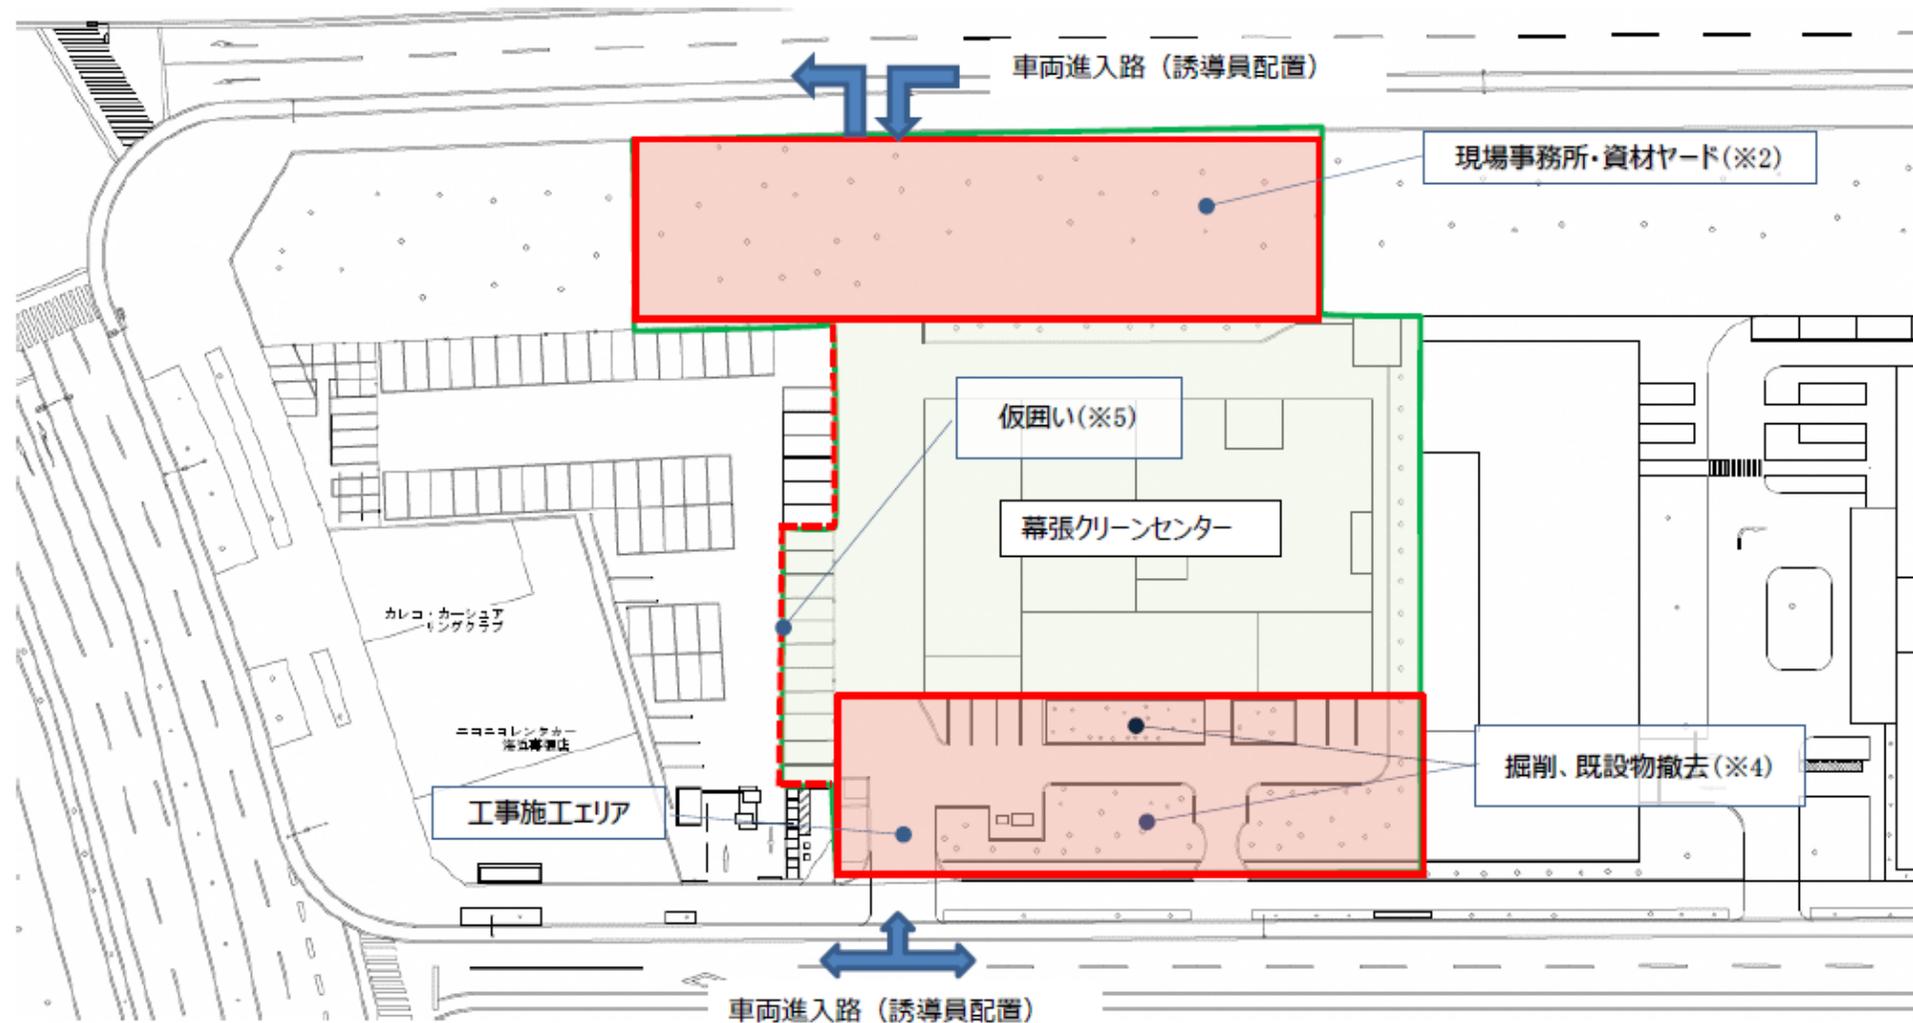

1. 工事概要図
