

25 監査報告第12号  
平成26年 3月31日

千葉市議会議長 宇留間 又衛門 様  
千葉市長 熊谷 俊人 様

|         |         |
|---------|---------|
| 千葉市監査委員 | 宮 下 公 夫 |
| 同       | 宮 原 清 貴 |
| 同       | 黒 宮 昇   |
| 同       | 石 橋 毅   |

地方自治法第199条第1項、第4項、第5項及び第7項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を提出します。

## 第2期工事定期監査結果報告

### 1 監査の対象

経済農政局、都市局

### 2 監査の範囲

平成24年度に実施した工事及び業務委託

### 3 監査の期間

平成25年11月1日から平成26年3月26日まで

### 4 監査の方法

今回の監査は、監査対象工事274件のうちから抽出した別表に掲げる監査実施工事50件、監査対象業務委託144件のうちから抽出した別表に掲げる監査実施業務委託15件について、工事及び業務委託が設計、積算、契約、施工等の各段階において、技術面から適正に行われているかを主眼として、経済性、効率性、有効性の視点にも留意し、設計図面、仕様書、設計書、契約書、施工計画書、工事記録写真、品質報告書等の関係書類を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し、実地調査を行った。

#### <主な着眼点>

##### (1) 設計・積算

- ・ 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。
- ・ 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。
- ・ 高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。
- ・ 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
- ・ 歩掛及び単価は適正か。また、諸経費は適切に算出されているか。

##### (2) 契約

- ・ 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。
- ・ 契約の履行期限は守られているか。
- ・ 追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内容は適切か。また、事務は適時、かつ適切に行われているか。

##### (3) 施工・検査

- ・ 工事施工計画は適切か。
- ・ 設計図書どおり施工されているか。
- ・ 法令等を遵守して施工されているか。
- ・ 各種承諾図書、工事記録写真等の受注者提出書類は整備されているか。
- ・ 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。
- ・ 安全管理、工程管理及び品質管理は適切に行われているか。

5 監査の結果

監査の対象局における工事及び業務委託のうち、設計、契約、検査については、おおむね適正に執行されていたが、積算、施工について次のとおり改善すべき事項が認められた。

(1) 積算について改善すべき事項


ア 道路区画線の設計単価を適正に積算すべきもの

[都市局：都市計画道路港町寒川町線外道路築造外工事、  
区画道路1号線外道路築造工事（東幕張地区）]

土木工事積算基準によると、道路の区画線の設計単価については、線種や幅などの仕様ごとの市場単価に、加算率を乗じて算出することとされている。また、加算率は区画線工事の総延長で判定するとされている。

しかしながら、当該工事2件においては、区画線の設計単価を算出するに当たり、市場単価に、線種や幅などの仕様ごとの延長を合算した総延長で判定した加算率を乗じて算出すべきところ、線種や幅などの仕様ごとの延長で判定した加算率を乗じて設計単価を算出していた。

区画線の設計単価については、土木工事積算基準に基づき適正に積算されたい。

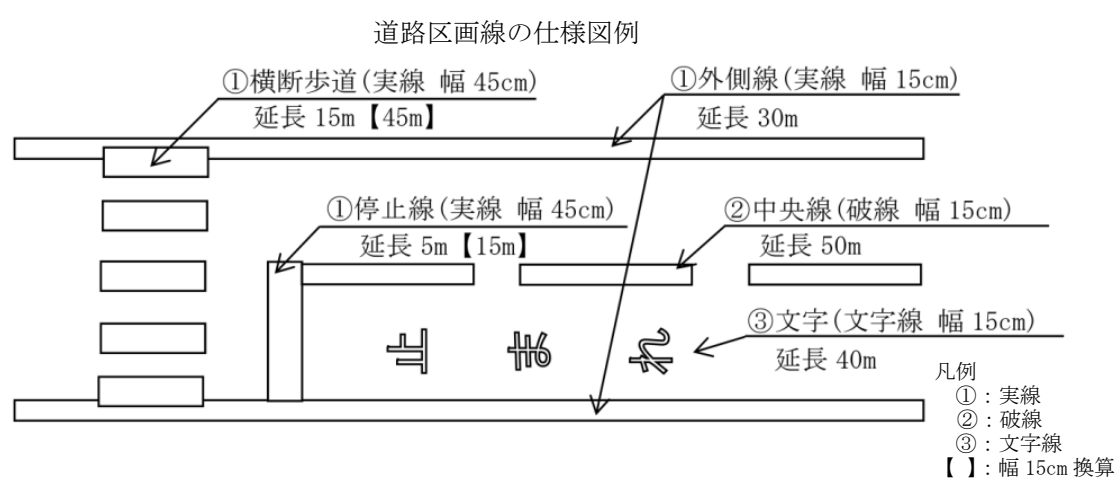

仕様ごとの積算例（溶融式区画線）

| 規 格            | 数量<br>(m) | 市場単価<br>(円) | 誤       |                | 正       |                |
|----------------|-----------|-------------|---------|----------------|---------|----------------|
|                |           |             | 加算率 (%) | 設計単価 (円)       | 加算率 (%) | 設計単価 (円)       |
| ①実線、幅 15 cm換算  | 90m       | a           | 60%     | $a \times 1.6$ | 30%     | $a \times 1.3$ |
| ②破線、幅 15 cm換算  | 50m       | b           | 60%     | $b \times 1.6$ | 30%     | $b \times 1.3$ |
| ③文字線、幅 15 cm換算 | 40m       | c           | 60%     | $c \times 1.6$ | 30%     | $c \times 1.3$ |
| 総延長            | 180m      |             |         |                |         |                |

(誤)・・・仕様ごとの延長で加算率を判定し、100m未満の60%としていた。  
(正)・・・仕様ごとの延長を合算した総延長「180m」で加算率を判定し、100m以上500m未満の30%が適用される。

|                  |         |
|------------------|---------|
| 加算率（溶融式区画線）      |         |
| 施工規模(総延長)が100m未満 | ・・・ 60% |
| 〃 100m以上500m未満   | ・・・ 30% |
| 〃 500m以上         | ・・・ 0%  |

## (2) 施工について改善すべき事項


ア さく井設備工事における監督職員の立会いを適正に行うべきもの

[都市局：千葉市立おゆみ野南小学校防災施設設置さく井外工事]

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）によると、さく井設備工事における掘削完了後の深度確認、ケーシング及びスクリーンの据付け並びに砂利充てんを行う場合には、施工上必要な指示や検査等を行うために、監督職員が立会うこととなっている。

しかしながら、本工事においては、非常用井戸の設置工事におけるケーシング及びスクリーンの据付け時の監督職員の立会いは行っていたが、掘削完了後の深度確認及び砂利充てん時における立会いは行っていなかった。

さく井設備工事における監督職員の立会いについては、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）に基づき適正に行われたい。

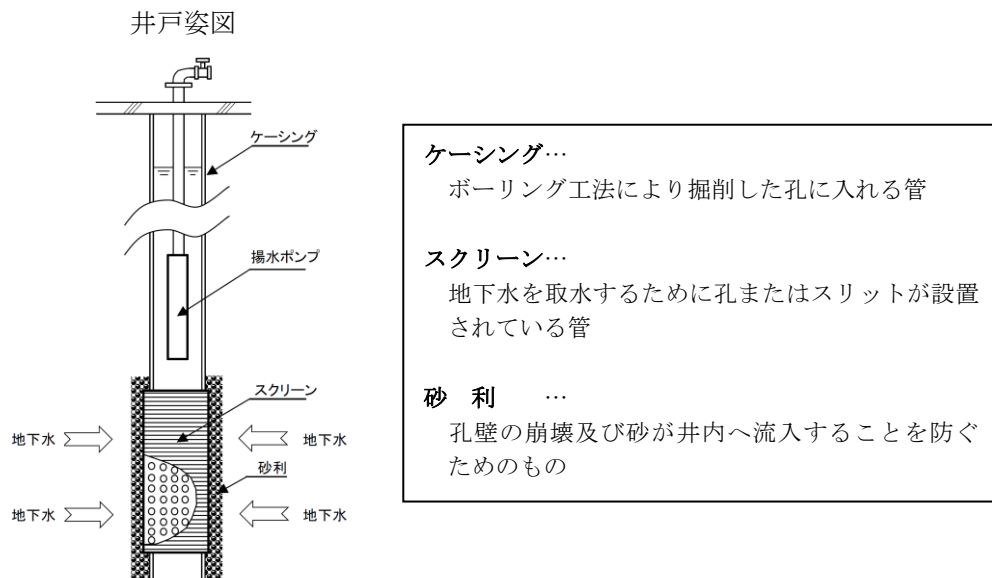

イ 高所作業における作業員の安全を確保すべきもの

[都市局：千葉市立幸町第三小学校屋内運動場耐震補強工事]

労働安全衛生規則によると、事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならないとされている。

しかしながら、本工事においては、屋内運動場附属屋のひさしの防水工事を行う際に、高さ2メートル以上の箇所で墜落の危険性があるにもかかわらず、手すり等が設けられていなかった。

高所作業においては、労働安全衛生規則を遵守し、作業員の安全を確保するよう受注者を指導されたい。

ウ 公園内の工事における公衆の安全を確保すべきもの

[都市局：神場公園外遊具交換工事]

建設工事公衆災害防止対策要綱によると、施工者は、土木工事を施工するに当たって作業し、材料を集積し又は機械類を置く等工事のために使用する区域（以下「作業場」という。）については、当該工事の関係者以外の第三者（以下「公衆」という。）が誤って作業場に立ち入ることのないよう、固定柵又はこれに類する工作物を設置しなければならないとされている。

しかしながら、本工事においては、遊具を交換するための作業場を公園内に設けていたが、公衆が誤って立ち入るおそれがあるにもかかわらず、固定柵等を設置していなかった。

公園内の工事においては、建設工事公衆災害防止対策要綱に基づき公衆の安全を確保するよう受注者を指導されたい。

## 別表

## 監査実施工事一覧表

## 経済農政局

| 部<br>名      | 課<br>名      | 番<br>号 | 工 事 名          | 工事箇所          | 契約金額(円)<br>(下段：変更後)     | 工 期<br>上段：自<br>中段：至<br>下段：変更後 |
|-------------|-------------|--------|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 農<br>政<br>部 | 農<br>業<br>環 | 1      | 宇那谷町農業用排水路整備工事 | 千葉市花見川区宇那谷町地内 | 9,424,800<br>10,519,950 | H24. 11. 8<br>H25. 3. 18      |
| 経済農政局       |             |        |                | 1 件           | 9,424,800               |                               |

※ 農業環：農業環境整備課

## 都市局

| 部<br>名      | 課<br>名                | 番<br>号 | 工 事 名                         | 工事箇所                     | 契約金額(円)<br>(下段：変更後)        | 工 期<br>上段：自<br>中段：至<br>下段：変更後           |
|-------------|-----------------------|--------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 都<br>市<br>部 | ま<br>ち<br>づ<br>く<br>り | 2      | ペDESTリアンDデッキ上部工桁製作工事          | 千葉市中央区新千葉1丁目地内           | 46,725,000<br>47,565,000   | H24. 8. 30<br>H25. 3. 15                |
|             |                       | 3      | 電線共同溝整備工事（新千葉地区24-1）          | 千葉市中央区新千葉1丁目地内外          | 11,537,400<br>11,923,800   | H24. 12. 18<br>H25. 3. 18               |
|             | 検<br>見<br>川           | 4      | 区画道路68号線外4道路舗装工事<br>（検見川稲毛地区） | 千葉市花見川区検見川町5丁目<br>地内     | 4,420,500                  | H24. 11. 17<br>H25. 1. 15               |
|             | 寒<br>川                | 5      | 都市計画道路港町寒川町線外道路築造外<br>工事      | 千葉市中央区港町地内外              | 16,508,100<br>18,704,700   | H24. 12. 27<br>H25. 3. 26<br>H25. 6. 30 |
|             | 東<br>幕<br>張           | 6      | 下水道排水施設工事（武石第3-2・<br>24-1工区）  | 千葉市花見川区武石町2丁目地内          | 34,125,000<br>36,817,200   | H24. 10. 11<br>H25. 2. 7<br>H25. 3. 12  |
|             |                       | 7      | 区画道路1号線外道路築造工事<br>（東幕張地区）     | 千葉市花見川区武石町2丁目地内<br>外1    | 16,585,800<br>17,349,150   | H24. 12. 14<br>H25. 3. 12<br>H25. 3. 25 |
|             | 住<br>宅<br>整           | 8      | 千葉市営住宅居待谷団地解体工事               | 千葉市緑区土気町1622番地外          | 13,238,505<br>17,178,000   | H24. 12. 22<br>H25. 3. 11<br>H25. 3. 25 |
| 建<br>築<br>部 | 営<br>繕<br>課           | 9      | 千葉市立稲毛高等学校校舎耐震補強工事            | 千葉市美浜区高浜3丁目1番1号          | 175,875,000                | H24. 6. 5<br>H25. 1. 30                 |
|             |                       | 10     | 千葉市立誉田中学校校舎耐震補強工事             | 千葉市緑区誉田町1丁目138<br>番地     | 73,500,000<br>87,876,600   | H24. 6. 26<br>H25. 1. 21<br>H25. 3. 18  |
|             |                       | 11     | 千葉市立高浜海浜小学校大規模改造工事            | 千葉市美浜区高浜4丁目8番2号          | 196,350,000<br>220,544,100 | H24. 7. 14<br>H25. 1. 9<br>H25. 2. 28   |
|             |                       | 12     | 千葉市立山王小学校校舎耐震補強工事             | 千葉市稲毛区山王町121番地           | 71,235,379<br>76,910,400   | H24. 7. 27<br>H25. 2. 21                |
|             |                       | 13     | 千葉市立幸町第三小学校屋内運動場耐震<br>補強工事    | 千葉市美浜区幸町1丁目10番<br>1号     | 22,890,000<br>23,988,300   | H24. 7. 28<br>H25. 1. 23<br>H25. 3. 6   |
|             |                       | 14     | 仮称千葉市桜木霊園合葬墓新築工事              | 千葉市若葉区桜木1丁目367<br>番地の一部外 | 172,515,000                | H24. 8. 1<br>H25. 3. 18                 |
|             |                       | 15     | 旧千葉市若葉消防署解体工事                 | 千葉市若葉区千城台西2丁目1番<br>1号    | 26,090,400<br>27,948,900   | H24. 9. 13<br>H25. 1. 10<br>H25. 2. 10  |

※ まちづくり：まちづくり推進課 検見川：検見川・稲毛土地区画整理事務所 寒川：寒川土地区画整理事務所  
東幕張：東幕張土地区画整理事務所 住宅整：住宅整備課

都市局

| 部<br>名      | 課<br>名                | 番<br>号 | 工<br>事<br>名                    | 工事箇所                     | 契約金額(円)<br>(下段：変更後)      | 工 期<br>上段：自<br>中段：至<br>下段：変更後           |
|-------------|-----------------------|--------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 建<br>築<br>部 | 営<br>繕<br>課           | 16     | 千葉市立稲毛中学校屋内運動場耐震補強工事           | 千葉市稲毛区稲毛町5丁目<br>120番地    | 54,369,000<br>55,756,050 | H24. 9. 15<br>H25. 3. 10                |
|             |                       | 17     | 千葉市立宮野木小学校エレベータ設置<br>建築工事      | 千葉市稲毛区宮野木町2100<br>番地     | 18,243,225<br>15,075,900 | H24. 10. 24<br>H25. 3. 15<br>H25. 3. 22 |
|             |                       | 18     | 千葉市立長作小学校渡り廊下耐震補強工事            | 千葉市花見川区長作町1273<br>番地     | 19,530,000<br>19,994,100 | H24. 10. 24<br>H25. 2. 20               |
|             |                       | 19     | 千葉市立新宿中学校校舎トイレ改修外工事            | 千葉市中央区問屋町1番73号           | 37,579,500<br>41,714,400 | H24. 10. 30<br>H25. 2. 26<br>H25. 3. 18 |
|             |                       | 20     | QVCマリンフィールドトイレ外改修工事            | 千葉市美浜区美浜1番地              | 106,050,000              | H24. 11. 9<br>H25. 2. 28                |
|             |                       | 21     | 千葉市こてはし温水プールガラスドーム<br>防水改修工事   | 千葉市花見川区三角町750番地          | 17,180,100               | H24. 11. 10<br>H25. 3. 9                |
|             |                       | 22     | 千葉市消防団第15分団2部器具置場<br>改築工事      | 千葉市緑区富岡町206番1の<br>一部外    | 16,999,500               | H24. 11. 28<br>H25. 3. 18               |
|             |                       | 23     | 千葉市立新宿中学校校舎増築杭打工事              | 千葉市中央区問屋町1番73号           | 23,835,000<br>24,220,350 | H24. 12. 11<br>H25. 2. 23<br>H25. 3. 18 |
|             |                       | 24     | 千葉市立高洲小学校屋根防水改修工事              | 千葉市美浜区高洲2丁目2番<br>20号     | 3,990,000                | H24. 12. 12<br>H25. 3. 18               |
|             | 建<br>築<br>設<br>備<br>課 | 25     | 千葉市立稲毛高等学校校舎耐震補強電気<br>設備工事     | 千葉市美浜区高浜3丁目1番1号          | 19,530,000               | H24. 6. 19<br>H25. 2. 13                |
|             |                       | 26     | 千葉市立稲毛高等学校校舎耐震補強冷暖房<br>設備工事    | 千葉市美浜区高浜3丁目1番1号          | 22,470,000               | H24. 6. 22<br>H25. 2. 16                |
|             |                       | 27     | 千葉市立幸町第三小学校屋内運動場耐震<br>補強電気設備工事 | 千葉市美浜区幸町1丁目10番<br>1号     | 6,426,000<br>6,722,100   | H24. 6. 19<br>H24. 12. 15<br>H25. 3. 14 |
|             |                       | 28     | 千葉市立山王小学校校舎耐震補強電気設備<br>工事      | 千葉市稲毛区山王町121番地           | 10,269,000<br>10,752,000 | H24. 6. 19<br>H25. 1. 14<br>H25. 2. 28  |
|             |                       | 29     | 千葉市立山王小学校校舎耐震補強給排水<br>設備工事     | 千葉市稲毛区山王町121番地           | 6,090,000                | H24. 7. 25<br>H25. 2. 19                |
|             |                       | 30     | 千葉市立宮野木小学校エレベータ設備工事            | 千葉市稲毛区宮野木町2100<br>番地     | 10,305,750               | H24. 7. 7<br>H24. 12. 18<br>H25. 3. 18  |
|             |                       | 31     | 千葉市立誉田中学校校舎耐震補強電気設備<br>工事      | 千葉市緑区誉田町1丁目138<br>番地     | 5,292,000<br>6,294,750   | H24. 7. 7<br>H25. 2. 1<br>H25. 3. 18    |
|             |                       | 32     | 千葉市立誉田中学校校舎耐震補強給排水<br>設備工事     | 千葉市緑区誉田町1丁目138<br>番地     | 4,163,250<br>9,989,700   | H24. 7. 31<br>H25. 2. 25<br>H25. 3. 18  |
|             |                       | 33     | 仮称千葉市桜木霊園合葬墓新築電気設備<br>工事       | 千葉市若葉区桜木1丁目367<br>番地の一部外 | 12,600,000               | H24. 7. 14<br>H25. 3. 10<br>H25. 3. 25  |
|             |                       | 34     | 仮称千葉市桜木霊園合葬墓新築換気設備<br>工事       | 千葉市若葉区桜木1丁目367<br>番地の一部外 | 6,678,000                | H24. 9. 14<br>H25. 3. 18                |
|             |                       | 35     | 千葉市立高浜海浜小学校大規模改造電気<br>設備工事     | 千葉市美浜区高浜4丁目8番2号          | 61,950,000<br>63,582,750 | H24. 7. 20<br>H25. 1. 15<br>H25. 2. 15  |

都市局

| 部<br>名                | 課<br>名                | 番<br>号 | 工<br>事<br>名               | 工事箇所                 | 契約金額(円)<br>(下段：変更後)      | 工 期<br>〔 上段：自<br>中段：至<br>下段：変更後 〕      |
|-----------------------|-----------------------|--------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 建<br>築<br>部           | 建<br>築<br>設<br>備<br>課 | 36     | 千葉市立高浜海浜小学校大規模改造給排水設備工事   | 千葉市美浜区高浜4丁目8番2号      | 45,675,000<br>52,633,350 | H24. 7. 25<br>H25. 1. 20<br>H25. 2. 15 |
|                       |                       | 37     | 千葉市立高浜海浜小学校大規模改造冷暖房設備工事   | 千葉市美浜区高浜4丁目8番2号      | 13,066,095               | H24. 8. 24<br>H25. 2. 19               |
|                       |                       | 38     | 千葉市立高浜海浜小学校エレベータ設備工事      | 千葉市美浜区高浜4丁目8番2号      | 10,916,850               | H24. 9. 7<br>H25. 3. 5                 |
|                       |                       | 39     | 千葉市立海浜病院昇降機改修工事           | 千葉市美浜区磯辺3丁目31番1号     | 88,200,000               | H24. 8. 1<br>H24.11.28                 |
|                       |                       | 40     | 千葉市立おゆみ野南小学校防災施設設置さく井外工事  | 千葉市緑区おゆみ野南4丁目26番地    | 8,158,500                | H24. 8. 4<br>H24.11.11<br>H25. 1. 26   |
|                       |                       | 41     | 千葉市防災行政無線（同報系）親局移設工事      | 千葉市中央区問屋町1番35号外6か所   | 13,230,000<br>16,797,900 | H24. 9. 27<br>H25. 3. 18<br>H25. 3. 25 |
|                       |                       | 42     | 千葉市立緑町小学校太陽光発電設備工事        | 千葉市稲毛区緑町2丁目13番1号     | 17,797,500               | H24.10.18<br>H25. 3. 18                |
|                       |                       | 43     | 千葉市立緑町小学校グラウンド散水設備工事      | 千葉市稲毛区緑町2丁目13番1号     | 10,599,750               | H24.11. 6<br>H25. 3. 18                |
|                       |                       | 44     | 千葉ポートアリーナ空調熱源改修工事         | 千葉市中央区問屋町1番20号       | 259,350,000              | H24.11. 6<br>H25. 9. 1                 |
|                       |                       | 45     | 花見川区役所直流電源装置改修工事          | 千葉市花見川区瑞穂1丁目1番地      | 10,920,000               | H24.12. 1<br>H25. 3. 18<br>H25. 3. 22  |
| 公<br>園<br>緑<br>地<br>部 | 公<br>園<br>建<br>設<br>課 | 46     | 千葉市立青葉病院成人精神科棟外医療ガス設備改修工事 | 千葉市中央区青葉町1273番地2     | 6,184,500                | H24.12. 4<br>H25. 3. 18                |
|                       |                       | 47     | 神場公園外遊具交換工事               | 千葉市花見川区畑町地内外         | 17,850,000<br>18,463,200 | H24. 9. 13<br>H25. 1. 10<br>H25. 2. 7  |
|                       |                       | 48     | 中西町公園（仮称）整備工事             | 千葉市緑区中西町地内           | 18,081,000               | H24.11.20<br>H25. 3. 18                |
|                       |                       | 49     | 黒砂台C公園（仮称）整備工事            | 千葉市稲毛区黒砂台3丁目地内       | 36,424,500<br>35,570,850 | H24.11.30<br>H25. 3. 18                |
|                       |                       | 50     | 仮称千葉市桜木霊園合葬墓新築外構植栽工事      | 千葉市若葉区桜木1丁目367番地の一部外 | 23,835,000<br>24,701,250 | H25. 3. 29<br>H25. 8. 5                |
| 都市局                   |                       |        |                           | 49件                  | 1,925,435,104            |                                        |



## 別表

## 監査実施業務委託一覧表

## 経済農政局

| 部名    | 課名   | 番号 | 委託名              | 委託箇所        | 契約金額(円)<br>(下段：変更後) | 委託期間<br>上段：自<br>中段：至<br>下段：変更後 |
|-------|------|----|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|
| 農政部   | 農業環境 | 1  | 農業用ため池改修実施設計業務委託 | 千葉市緑区大木戸町地内 | 1,740,900           | H24. 5. 26<br>H24. 8. 23       |
| 経済農政局 |      |    |                  | 1 件         | 1,740,900           |                                |

※ 農業環境：農業環境整備課

## 都市局

| 部名  | 課名    | 番号 | 委託名                               | 委託箇所                  | 契約金額(円)<br>(下段：変更後)      | 委託期間<br>上段：自<br>中段：至<br>下段：変更後          |
|-----|-------|----|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 都市部 | まち    | 2  | 千葉駅西口駅前修景広場実施設計業務委託               | 千葉市中央区新千葉1丁目地内        | 3,136,350                | H24. 12. 11<br>H25. 3. 10               |
|     | 検見川   | 3  | 区画道路68号線外3道路・下水道実施設計業務委託（検見川稲毛地区） | 千葉市花見川区検見川町5丁目地内      | 7,362,600                | H25. 1. 25<br>H25. 3. 18                |
| 建築部 | 住宅整備課 | 4  | 千葉市東幕張地区仮設住宅新築実施設計業務委託            | 千葉市花見川区武石町2丁目617番1    | 4,294,500                | H24. 6. 5<br>H24. 8. 23<br>H24. 9. 22   |
|     |       | 5  | 千葉市東幕張地区仮設住宅新築地質調査業務委託            | 千葉市花見川区武石町2丁目617番1    | 840,000                  | H24. 6. 22<br>H24. 8. 5                 |
|     | 営繕課   | 6  | 千葉市立幕張中学校外1校校舎耐震補強実施設計業務委託        | 千葉市花見川区幕張町4丁目45番地外1か所 | 11,382,000<br>18,426,450 | H24. 2. 21<br>H24. 11. 30<br>H25. 1. 31 |
|     |       | 7  | 千葉市立磯辺第四小学校大規模改造実施設計業務委託          | 千葉市美浜区磯辺4丁目16番1号      | 15,750,000<br>15,325,800 | H24. 6. 8<br>H24. 11. 30                |
|     |       | 8  | 千葉市立幕張西中学校校舎耐震補強実施設計業務委託          | 千葉市美浜区幕張西2丁目9番1号      | 12,600,000<br>7,814,100  | H24. 7. 11<br>H25. 2. 4                 |
|     |       | 9  | 千葉市立高浜海浜小学校大規模改造工事監理業務委託          | 千葉市美浜区高浜4丁目8番2号       | 8,715,000                | H24. 8. 9<br>H25. 3. 15                 |
|     |       | 10 | （仮称）高洲市民プール・体育館改築地質調査業務委託         | 千葉市美浜区高洲4丁目2番2        | 2,457,000                | H24. 10. 18<br>H25. 1. 30               |
|     |       | 11 | 千葉市立幕張小学校エレベータ設置実施設計業務委託          | 千葉市花見川区幕張町4丁目781番地    | 1,774,500                | H24. 11. 6<br>H25. 3. 20                |
|     |       | 12 | 青葉病院救急棟増築外実施設計業務委託                | 千葉市中央区青葉町1273番地2      | 24,150,000               | H24. 12. 14<br>H25. 10. 9               |
|     |       | 13 | 千葉市立高等特別支援学校（仮称）耐震補強実施設計業務委託      | 千葉市美浜区真砂5丁目18番1号      | 18,354,000               | H24. 12. 18<br>H25. 3. 18<br>H25. 4. 30 |
|     | 建築設備課 | 14 | 美浜区役所空調熱源改修実施設計業務委託               | 千葉市美浜区真砂5丁目15番1号      | 7,119,000                | H24. 7. 18<br>H25. 2. 12                |
|     |       | 15 | QVCマリンフィールド中央監視制御装置改修実施設計業務委託     | 千葉市美浜区美浜1番地           | 1,739,850                | H25. 1. 11<br>H25. 3. 25                |
| 都市局 |       |    |                                   | 14件                   | 119,674,800              |                                         |

※ まち：まちづくり推進課 検見川：検見川稲毛土地区画整理事務所
