

ボーリング柱状図

調査名 千葉市立幸町第一中学校他 1 校地質調査業務委託（きつきが丘中学校）

ボーリングNo. 1

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	N o . 1		調査位置	千葉市美浜区幸町 2 丁目 1 2 番 7 号 他 1 か 所				北 緯	
発注機関	千葉市役所建築部保全課				調査期間	平成 8 年 1 2 月 2 日 ~ 8 年 1 2 月 3 日			東 経
調査業者名	主任技師				現 場 代 理 人	コ ア 鑑 定 者		ボーリング 責 任 者	
孔口標高		角 度	180° 上 90° 下	方 向	北 270° 西 180° 南 東 90°	地盤勾配	鉛直 90° 水平	使用機種	試錐機 D - 1 - B エンジン N S 1 0
総掘進長	22.45m							ハンマー 落下用具 ポンプ	コーンブーリ法 V 5

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記 事	孔内水位 (m)／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試験採取		室内試験 ()	掘進 月 日	
											深 度 (m)	この 打撃回数		打撃回数／貫入量 (cm)	N 値 — o —	深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試料 番号			採取 方法
												10cm	20cm									
1					埋 土	褐 灰 、 黒 灰			上部粘性土。砂質土。 下部黒ボク土ローム主体。		1.15	2	4	4	10/30	10						12月2日
2			2.70								1.45	2	3	3	8/30	8						
3			2.70								2.15	2	3	3	8/30	8						
4					ローム	茶 褐			含水少位。 スコリアM、炭化物混入。 植物混入する。		2.45	1	2	2	5/30	5						
5			2.50								3.15	1	2	2	5/30	5						
6			5.20		ローム質粘土	茶 褐			含水中位。粘性中位。 スコリア、炭化物混入。 全体に緩い。		3.45	2	4	4	10/30	10						
7					凝灰質粘土	茶 褐			含水中位。粘性大。 スコリア、腐植物、炭化物混入する。		4.15	2	4	4	10/30	10						
8			1.70		粘土質砂	褐 灰			含水中位。粘性大。 浮石少量混入する。 全体に粘性強い。		4.45	1	2	2	5/30	5						
9			6.90								5.12	1	2	2	5/30	5						
10											5.42	1	2	2	5/30	5						
11			1.60								6.15	1	2	2	5/30	5						
12			8.50								6.45	1	1	1	3/30	3						
13											7.15	1	1	1	3/30	3						
14			1.40								7.45	1	1	2	4/30	4						
15			9.90								8.15	1	1	2	4/30	4						
16											8.45	2	2	2	6/30	6						
17											9.15	2	2	2	6/30	6						
18											9.45	3	4	5	12/30	12						
19											10.15	4	5	7	16/30	16						
20											10.45	4	5	7	16/30	16						
21											11.15	5	8	10	23/30	23						
22											11.45	5	7	12	24/30	24						
23											12.15	6	8	12	26/30	26						
24											12.45	6	8	12	26/30	26						
25											13.15	6	8	12	26/30	26						
26											13.45	6	8	12	26/30	26						
27											14.15	6	8	12	26/30	26						
28											14.45	6	6	11	23/30	23						
29											15.15	7	10	12	29/30	29						
30											15.45	7	10	12	29/30	29						
31											16.15	6	8	13	27/30	27						
32											17.15	7	14	13	34/30	34						
33											17.45	7	14	13	34/30	34						
34											18.15	7	13	16	36/30	36						
35											18.45	8	12	14	34/30	34						
36											19.15	7	10	18	35/30	35						
37											19.45	4	4	5	13/30	13						
38											20.15	4	4	5	13/30	13						
39											20.45	4	4	5	13/30	13						
40											21.15	4	4	5	13/30	13						
41											21.45	4	4	5	13/30	13						
42											22.15	4	4	5	13/30	13						
43											22.45	4	4	5	13/30	13						

ボーリング柱状図


調査名 千葉市立幸町第一中学校他 1 校地質調査業務委託（きつきが丘中学校）

ボーリングNo. 2

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 2		調査位置	千葉市美浜区幸町 2 丁目 1 2 番 7 号 他 1 か 所			北 緯		
発注機関	千葉市役所 建築部 保全課			調査期間	平成 8 年 1 2 月 4 日 ~ 8 年 1 2 月 4 日			東 経	
調査業者名	主任技師			現 場 代 理 人	コ ア 鑑 定 者			ボーリング責任者	
孔口標高		角 度	180° 上 下 0° 90°	方 向	北 0° 270° 西 180° 90° 東 0° 南	地盤公配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試 錐 機
総掘進長	13.45m							エンジン	D - 1 - B
									ハンマー落下用具
									ポンプ
									コーンブーリ法
									V 5

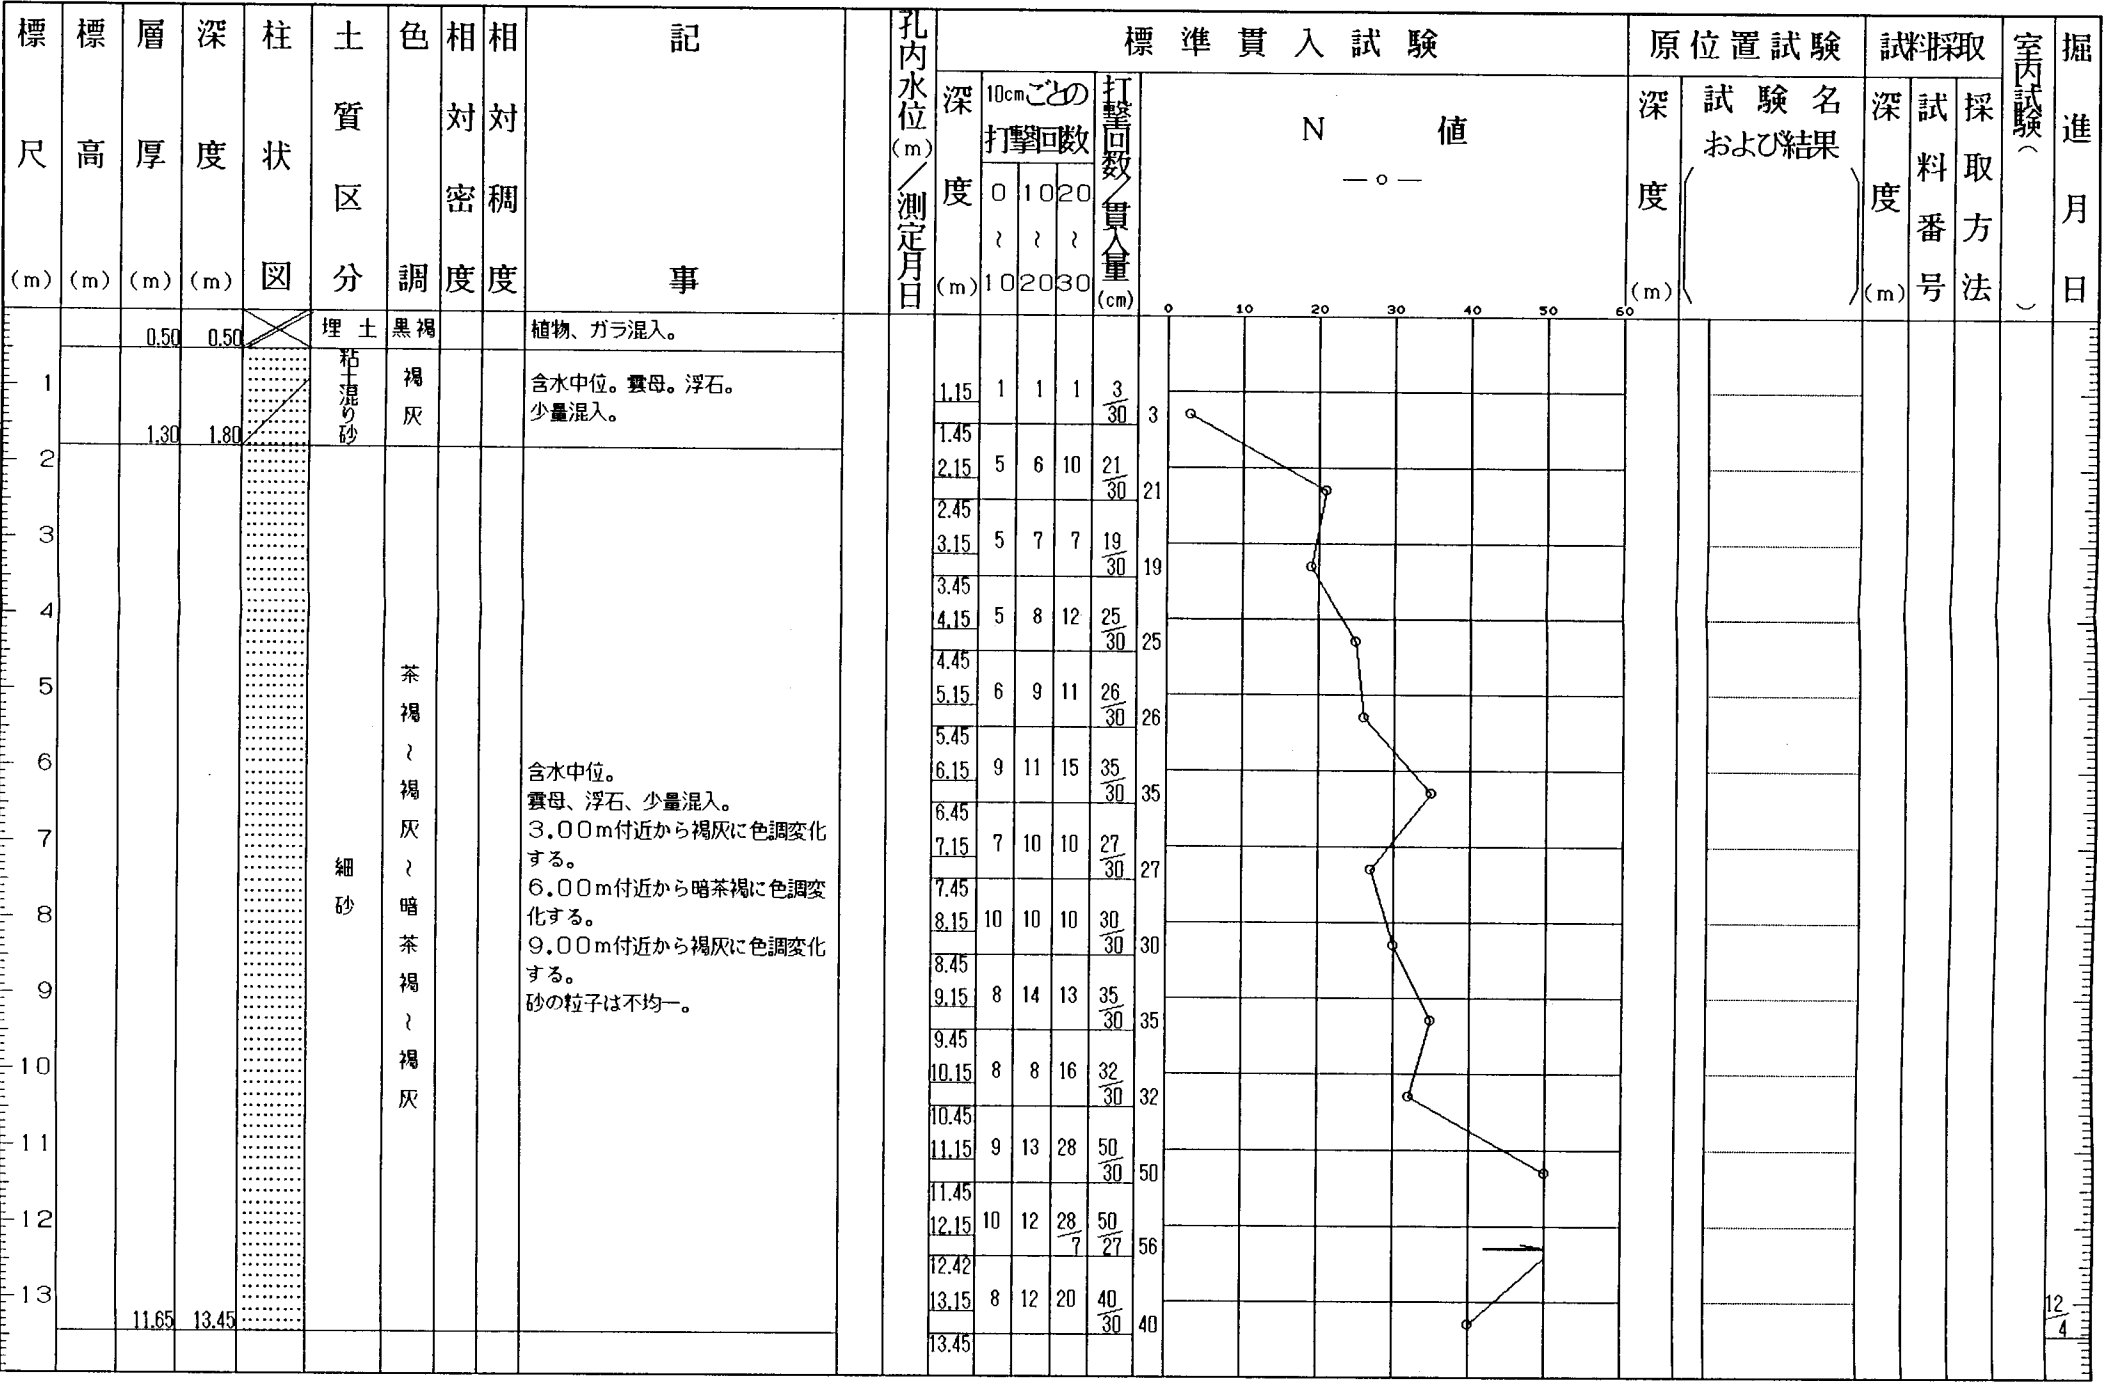

ボーリング柱状図

調 査 名 千葉市立さつきが丘中学校エレベータ設置地質調査業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シート No. _____

ボーリング名	No. 1			調査位置		千葉県千葉市花見川区さつきが丘2丁目15番地						北緯	35° 40' 5.1″		
発注機関	千葉県 都市局 建築部 営繕課					調査期間		平成24年10月5日～24年10月9日					東経	140° 5' 29.2″	
調査業者名				主任技師				現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者			
孔口標高	KBM -0.27m	角 度		方 向		地盤勾配		使用機種	試錐機	東邦地下工機 D0-D		ハンマー落下用具	半自動落下装置		
総掘進長	20.45m								エンジン	ヤンマー NFDK-9		ポンプ	扶桑工業 V6-B		

[illegible]
