


【資料 1－2】

平成 21 年度第 2 回審査会における質問・意見等と事業者の見解

No	質 問 ・ 意 見 等	事 業 者 見 解
1	建設機械の稼働に伴う騒音については、事例などで示したほうがいいのではないか。	千葉火力発電所 1・2 号系列の建設時に敷地境界において騒音を測定しています。騒音の最大値は工事着工月に発生しており、その結果は下図のとおりです。なお、工事期間中「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 (L ₅)」の 85 デシベルを上回ることはありませんでした。

工事中騒音測定結果

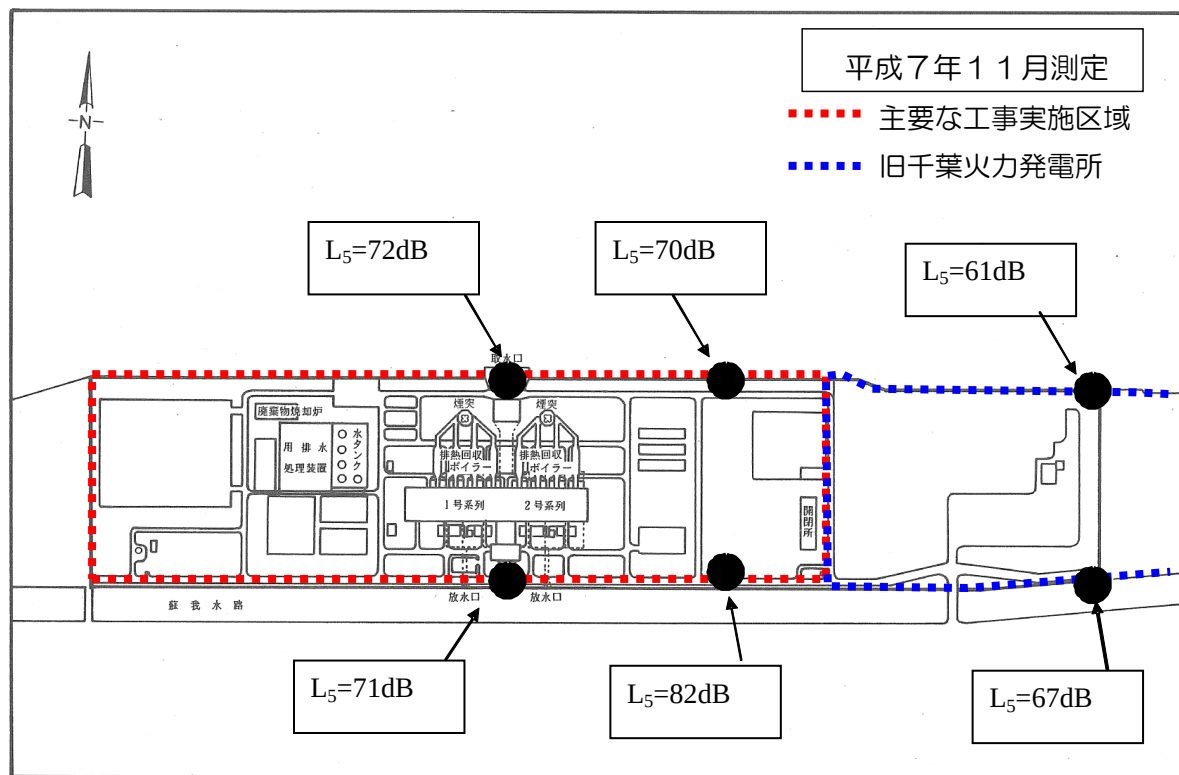

注 1：工事期間中において、騒音の最大値が観測された日（工事開始 1 ヶ月目）の測定結果

注 2：なお、旧千葉火力発電所 1～6 号機運転中に観測されたものである。
