資料３
【別図】

千葉市水道事業中期経営計画の評価について

千葉市
CHIBA CITY

令和3年度第１回
千葉市水道事業運営協議会
令和3年8月18日（水）

千葉市水道局

送水管の二系統化

送水管布設　φ300　L =990m（計画：　L =990m ）

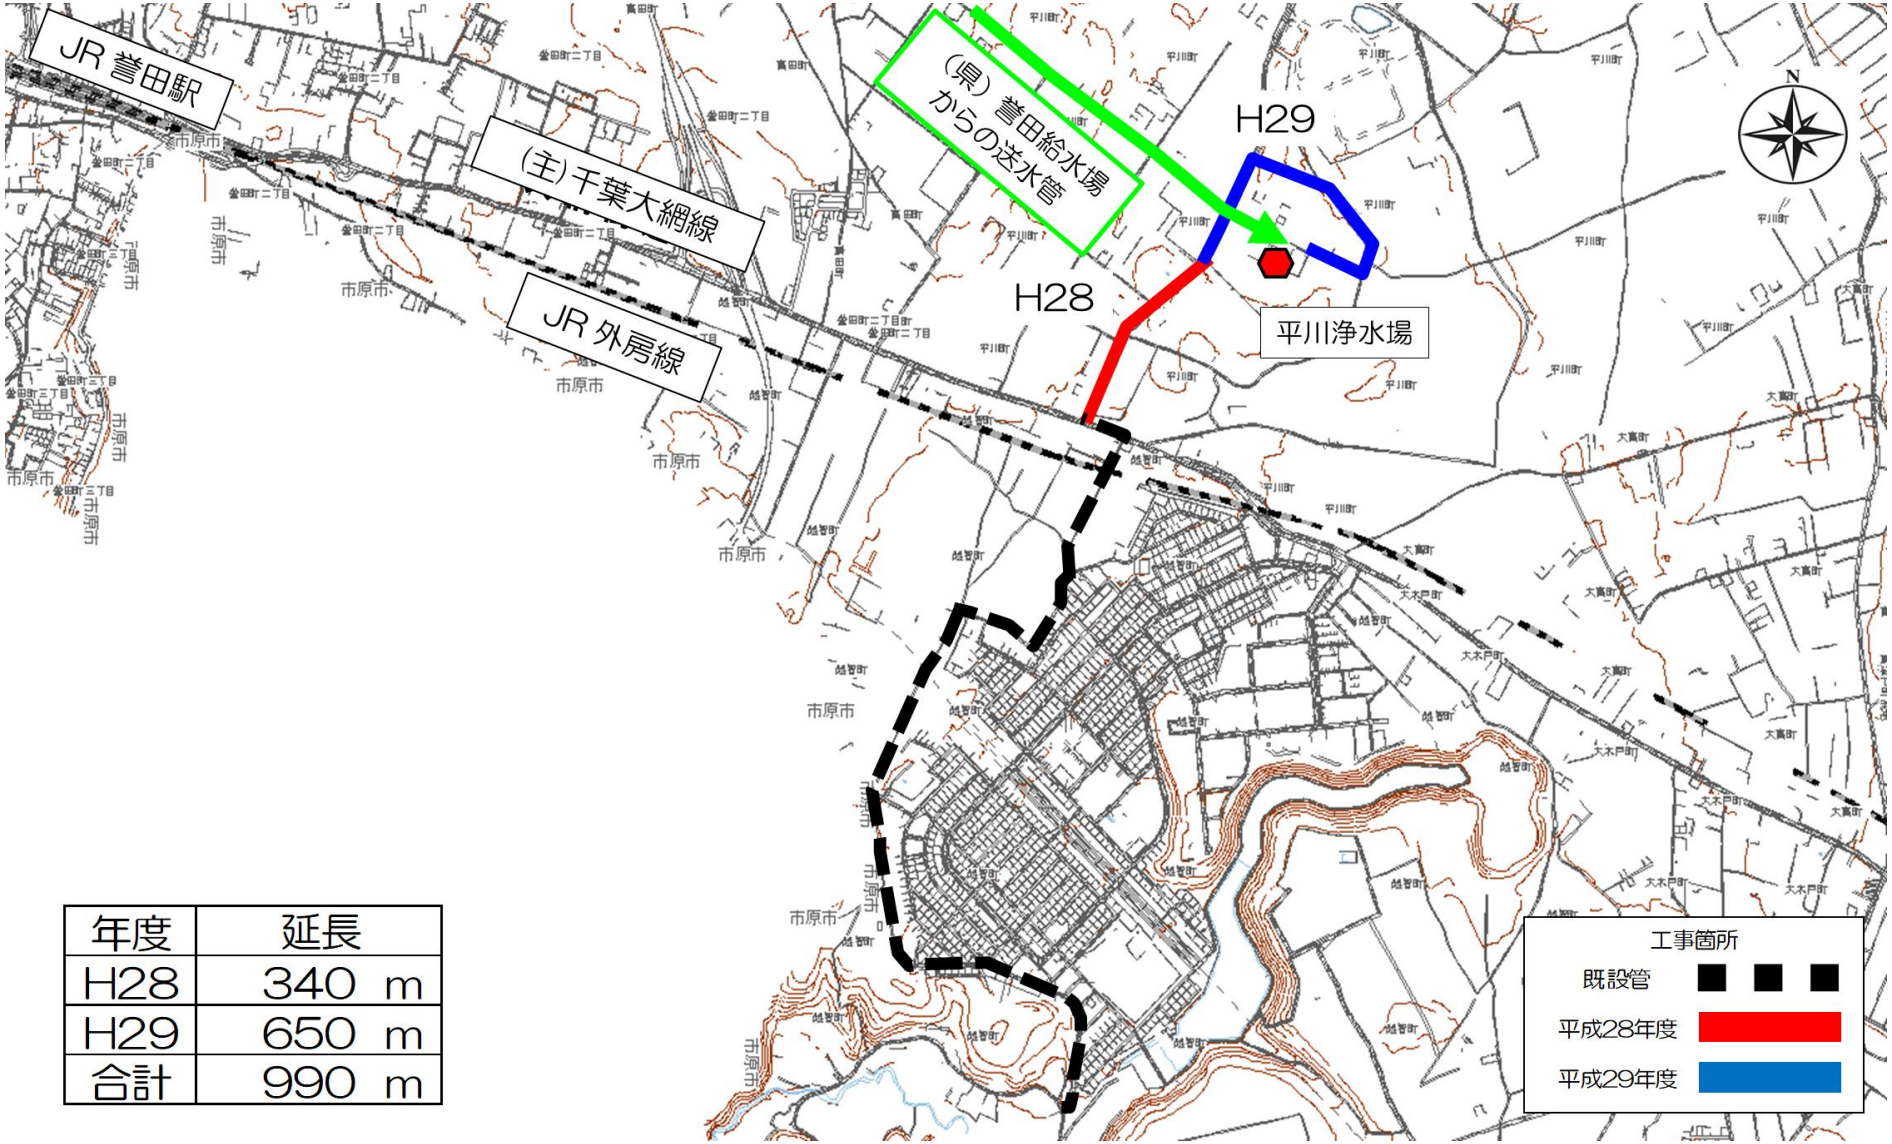

年度	延長
H28	340　m
H29	650　m
合計	990　m

平川浄水場の設備更新他

受変電設備、無停電電源設備、監視制御設備更新

年度	台数
H28	実施設計
H29	2 台
H30	10 台
H31	4 台
合計	16 台

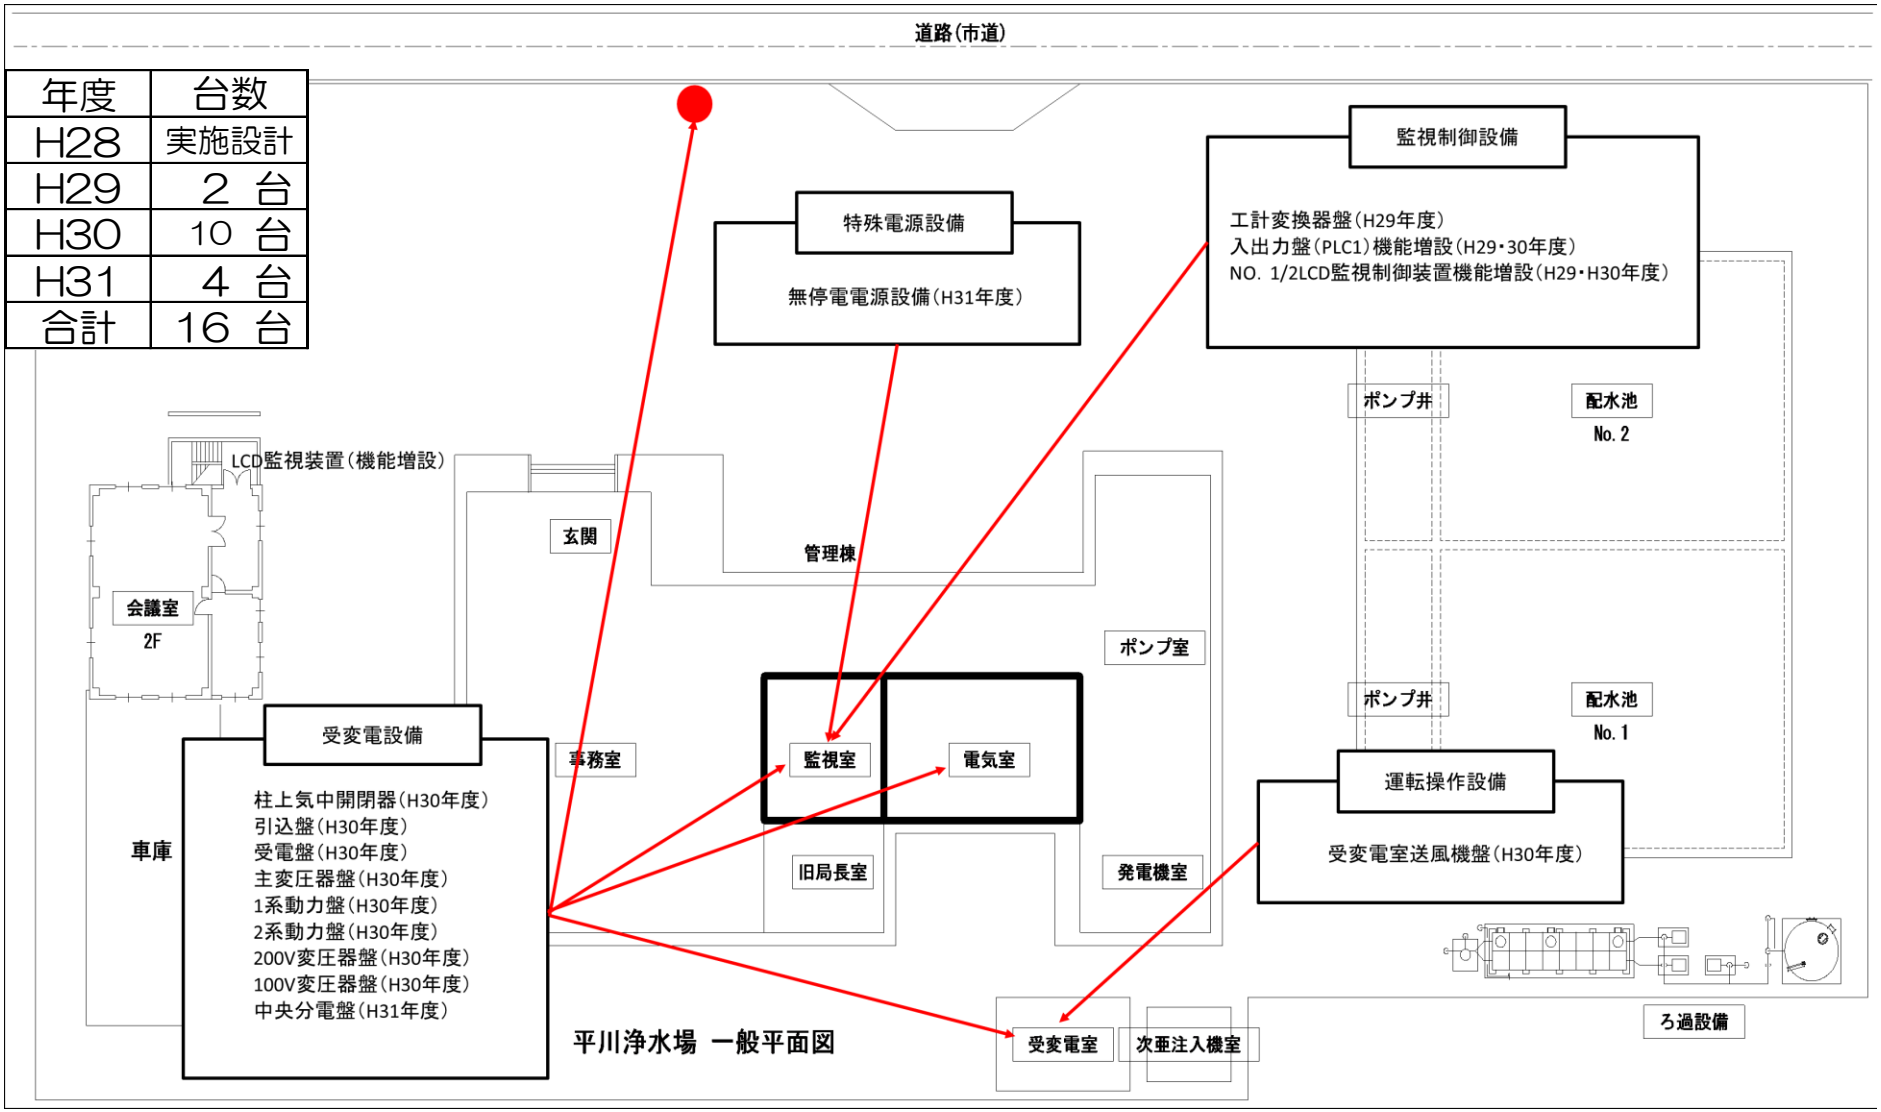

企業債残高の縮減

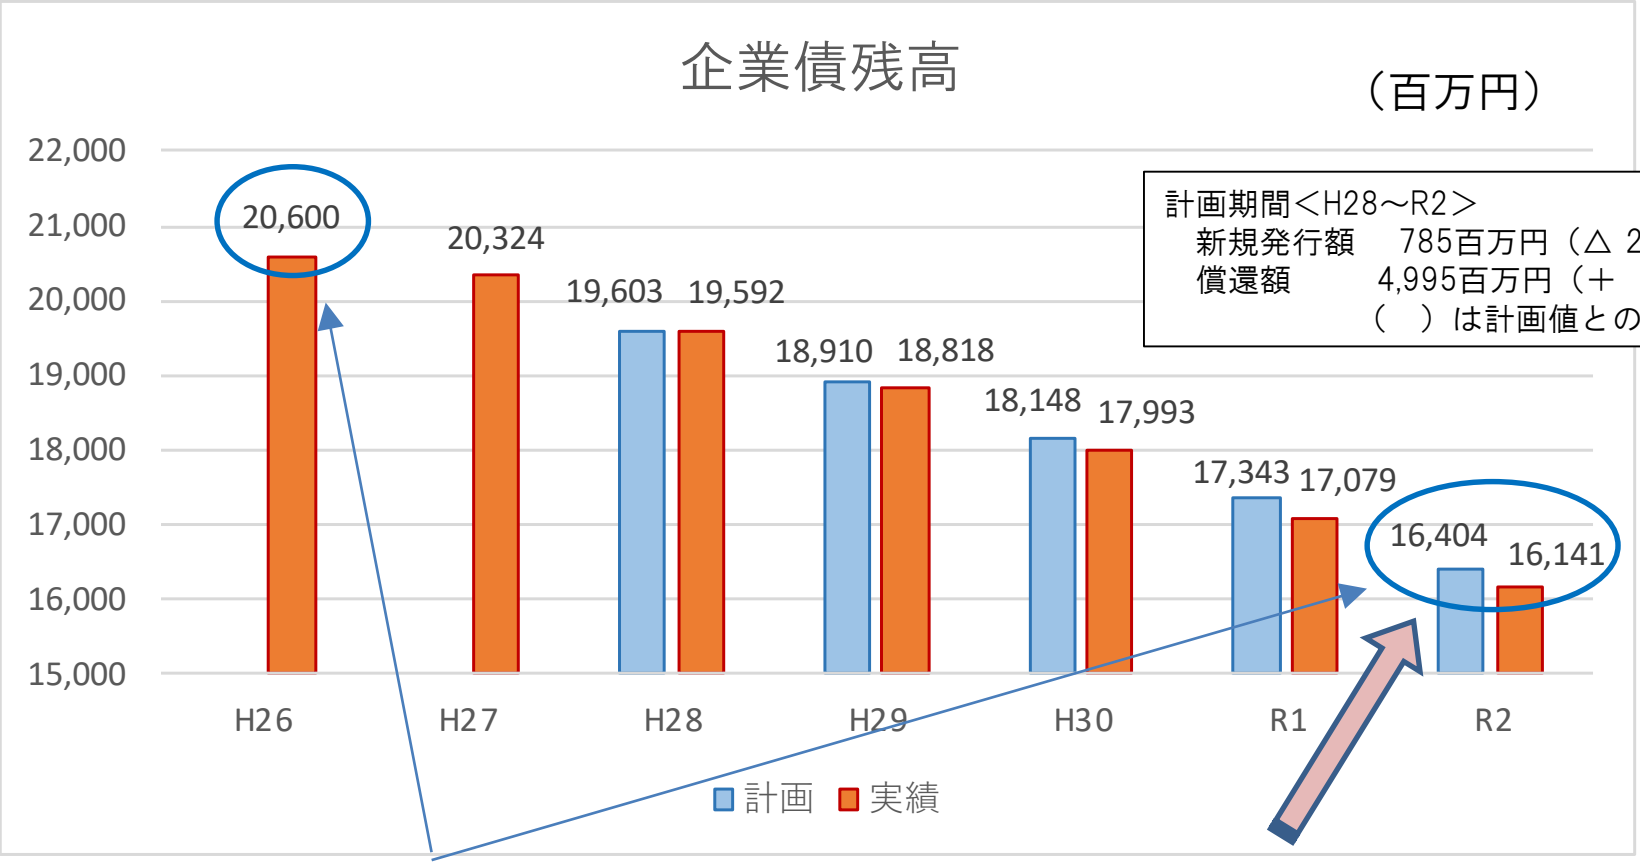

ピークから45億円の縮減
（ H26 206億円 ⇒ R2 161億円 ）

計画と比べて3億円の縮減
（ 164億円 ⇒ 161億円 ）

未普及地域の配水管整備（若葉区御殿町）

配水管布設　φ75～150　L ＝ 2,477m（計画： L ＝ 3,380m ）

年度	延長
H28	812 m
H29	1,233 m
H30	舗装復旧工事
H31	432 m
	舗装復旧工事
合計	2,477 m

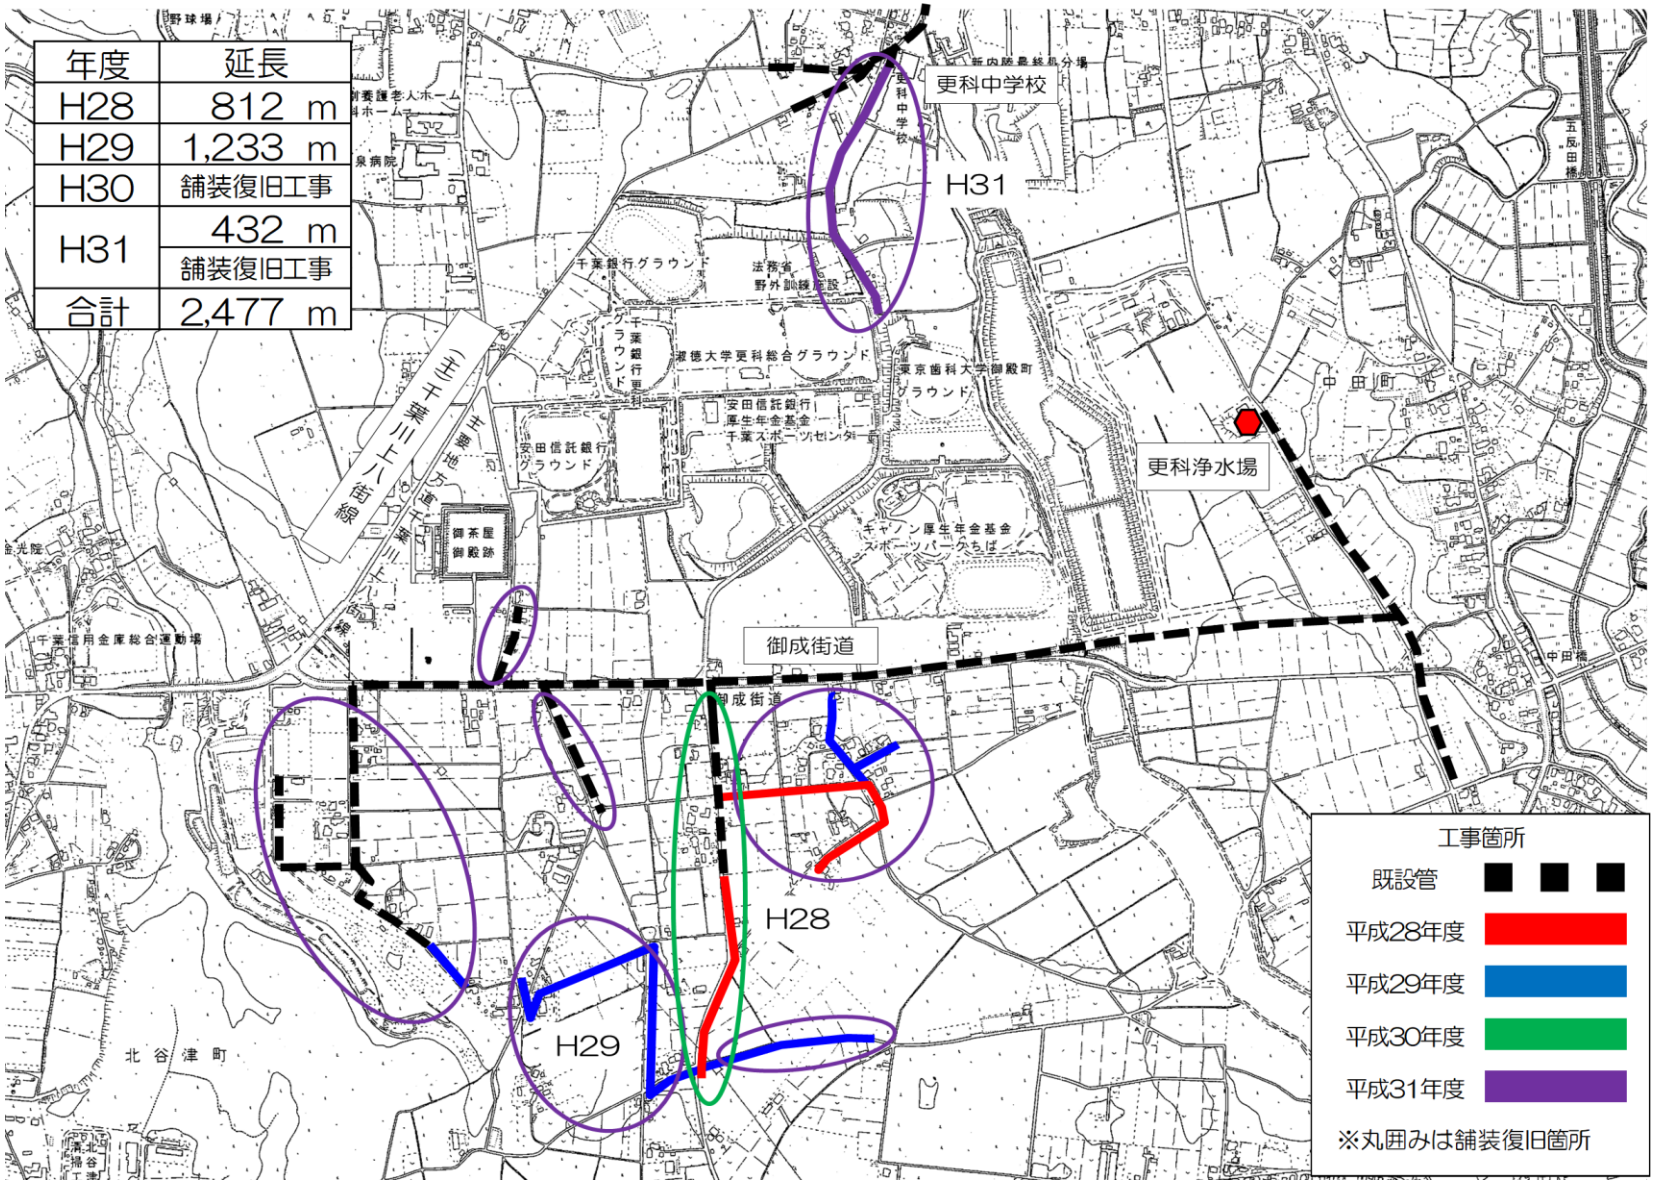

未普及地域の配水管整備（若葉区下田町）

配水管増径改良　φ50・75 → φ100・150　L=995m（計画：L=990m）
配水管布設　φ150　L=452m（計画：L=900m）

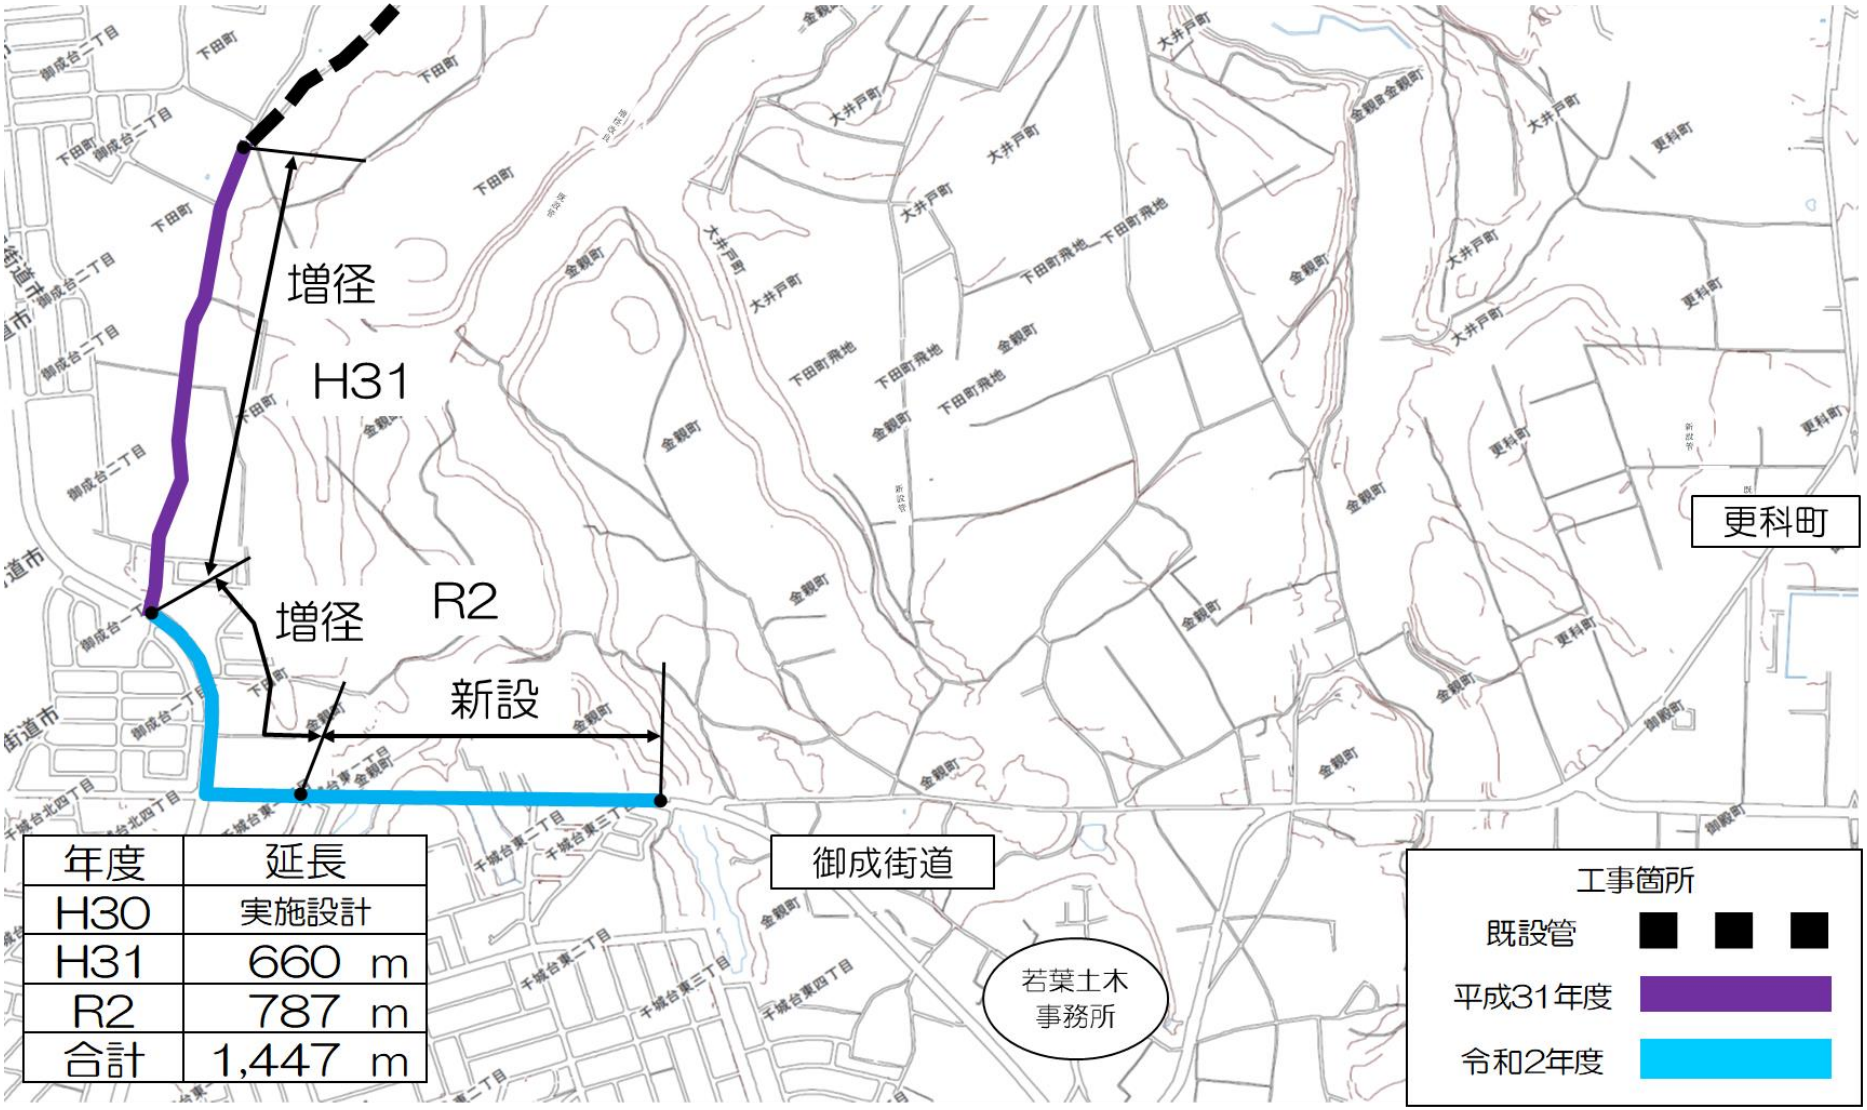

年度	延長
H30	実施設計
H31	660 m
R2	787 m
合計	1,447 m

未普及地域の配水管整備（緑区土気町）

配水管布設　φ50～150　L=470m（計画：　L=470m ）

年度	延長
H28	470 m
H29	舗装復旧工事
合計	470 m

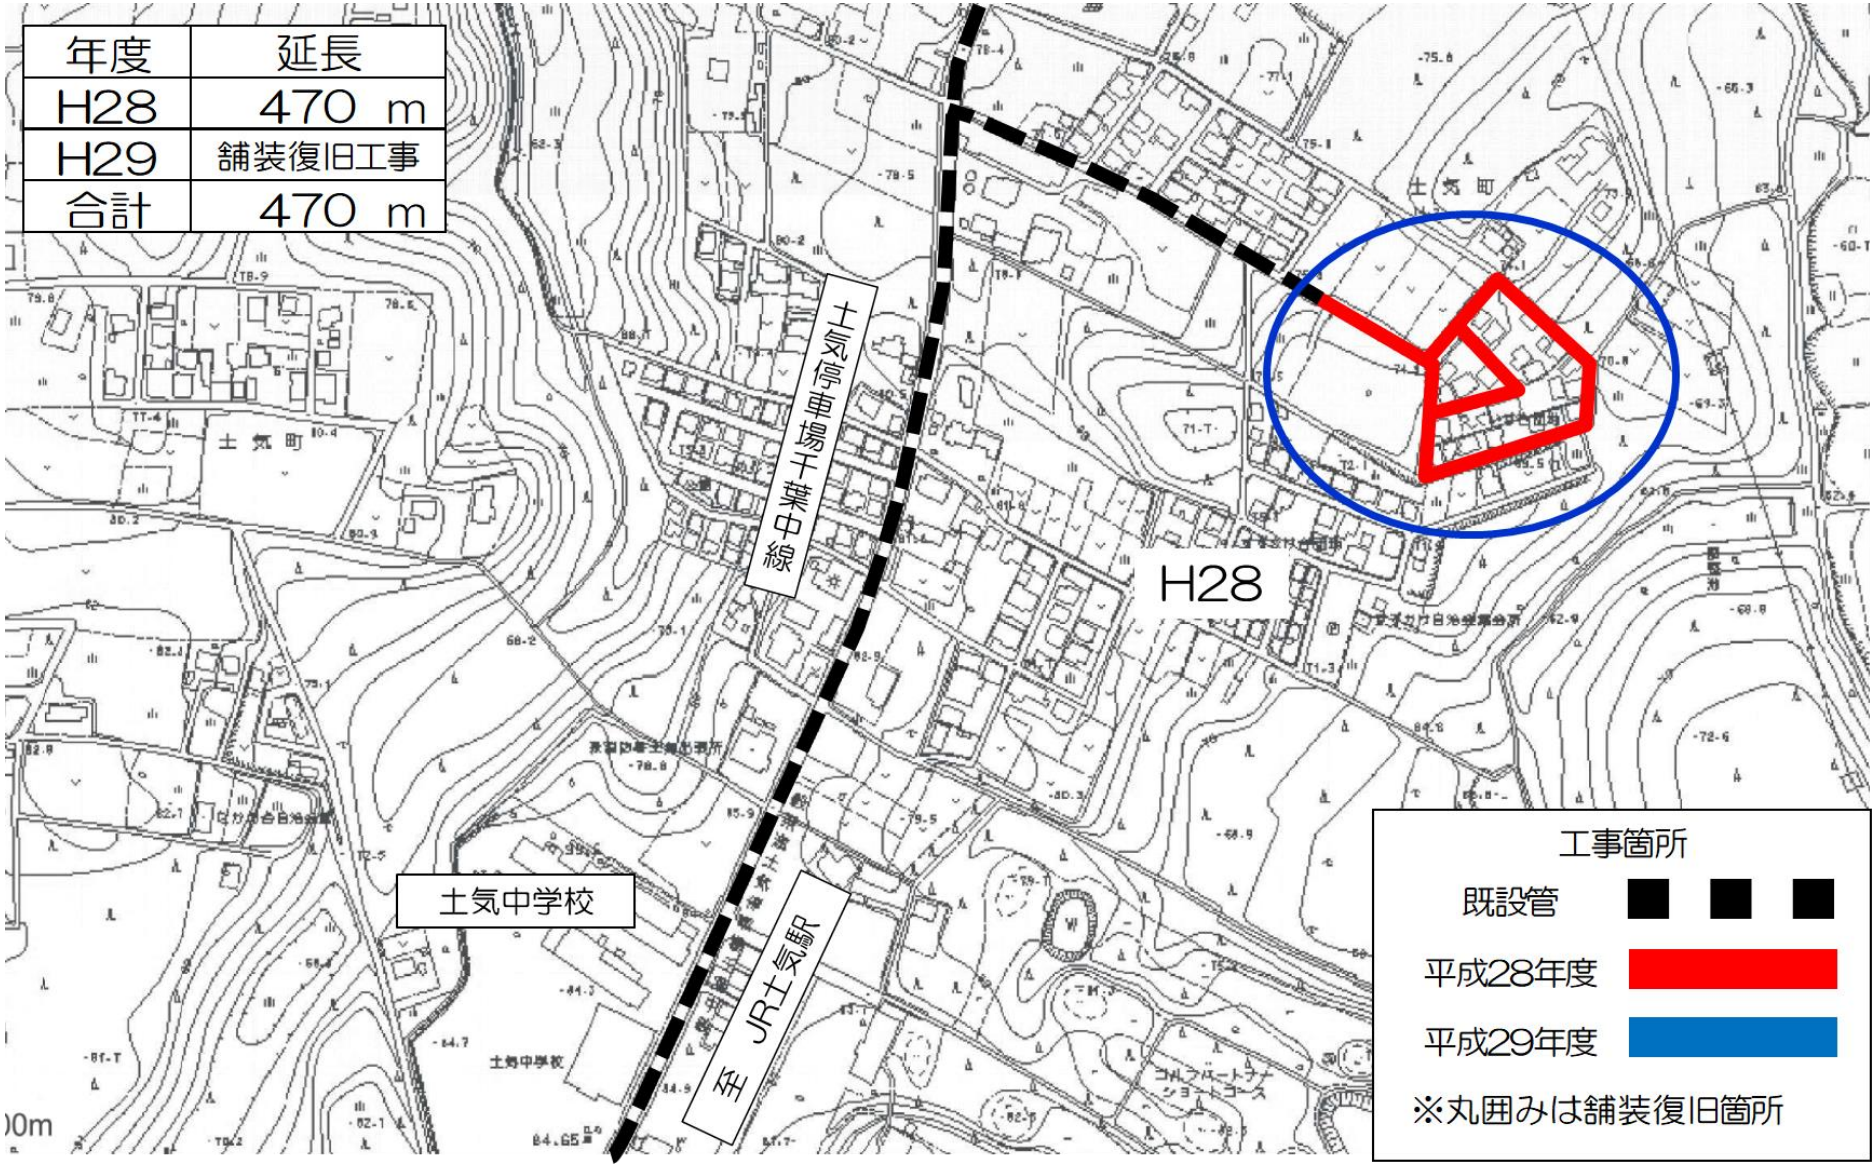

一般会計繰入金

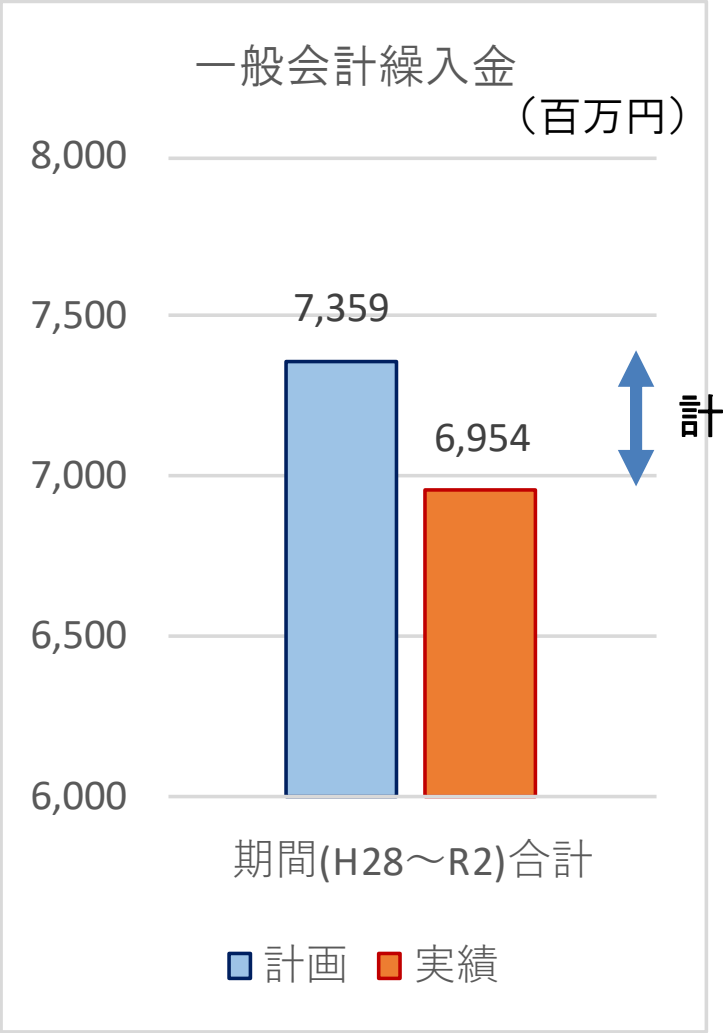

赤字を一般会計繰入金で穴埋め

計画の範囲内に収まっていれば

収支計画全体としての達成

計画　74億円　→　実績　70億円
（4億円の縮減）

収支計画を達成

一般会計繰入金　（百万円）

	H28	H29	H30	R1	R2	合計
計画	1,424	1,443	1,486	1,479	1,527	7,359
実績	1,243	1,265	1,410	1,391	1,645	6,954
差	△ 181	△ 178	△ 76	△ 88	118	△ 405
