

平成24年度
監 査 報 告 書
(I)

第 1 期 工 事 定 期 監 査 結 果 報 告

千葉市監査委員

2 4 監 査 報 告 第 7 号

平成 2 4 年 1 1 月 5 日

千葉市議会議長 小 川 智 之 様

千 葉 市 長 熊 谷 俊 人 様

千葉市監査委員 宮 下 公 夫

同 宮 原 清 貴

同 茂手木 直 忠

同 布 施 貴 良

地方自治法第 1 9 9 条第 4 項の規定により監査を実施したので、同条第 9 項
の規定により監査の結果に関する報告を提出します。

第 1 期工事定期監査結果報告

1 監査の対象

建設局、水道局

2 監査の範囲

平成 23 年度に実施した工事及び業務委託

ただし、必要がある場合は、上記以外の期間も範囲とした。

3 監査の期間

平成 24 年 4 月 2 日から平成 24 年 10 月 31 日まで

4 監査の方法

今回の監査は、監査対象工事 457 件のうちから抽出した別表に掲げる監査実施工事 100 件並びに監査対象業務委託 117 件のうちから抽出した別表に掲げる監査実施業務委託 30 件について、工事及び業務委託が設計、積算、契約、施工等の各段階において、技術面から適正に行われているかを主眼として、経済性、効率性、有効性の視点にも留意し、設計図面、仕様書、設計書、契約書、施工計画書、工事記録写真、品質報告書等の関係書類を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し、実地調査を行った。

<主な着眼点>

(1) 設計・積算

- ・ 現地の状況を十分に調査し、設計に反映されているか。
- ・ 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。
- ・ 高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。
- ・ 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
- ・ 歩掛及び単価は適正か。また、諸経費は適切に算出されているか。

(2) 契約

- ・ 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。
- ・ 契約の履行期限は守られているか。
- ・ 追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内容は適切か。また、事務は適時、かつ、適切に行われているか。

(3) 施工・検査

- ・ 工事施工計画は適切か。
- ・ 設計図書どおり施工されているか。
- ・ 法令等を遵守して施工されているか。

- ・ 各種承諾図書、工事記録写真等の受注者提出書類は整備されているか。
- ・ 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。
- ・ 安全管理、工程管理及び品質管理は適切に行われているか。

5 監査の結果

監査の対象局における工事及び業務委託のうち、契約、検査については、おおむね適正に執行されていたが、設計・積算、施工について次のとおり改善すべき事項が認められた。

(1) 設計・積算について改善すべき事項

ア 転落防止柵の設計を適正に行うべきもの

[建設局：鎌取町28号線外2道路改良工事]

道路における防護柵の一般的技術基準を定めた防護柵の設置基準によると、歩道等の路外が危険な区間などで、歩行者等の転落を防止するために必要と認められる区間においては、道路及び交通の状況を踏まえ、歩行者自転車用柵（以下「転落防止柵」という。）を設置するものとされ、柵の高さは、1.1メートルを標準とし、柵の間隔は、歩行者等が容易にすり抜けられないものとされている。


また、同基準の解説によると、転落防止柵の形状は、児童等が柵をよじ登ったり、柵をすり抜けて転落することを防止するために、柵の構造は縦柵で、間隔は15センチメートル以下とすることが望ましいとされている。

しかしながら、本工事においては、高低差が約3メートルある道路に階段を新設して、階段部分に高さ1.1メートルの転落防止柵を設置したが、柵の構造が横柵で、間隔が27センチメートルの4段仕様となっているため、児童等が階段下のコンクリート面に転落する可能性がある。

転落防止柵の設計については、防護柵の設置基準に基づき、適正に行われたい。

現場状況の写真

転落防止柵と階段の設置状況

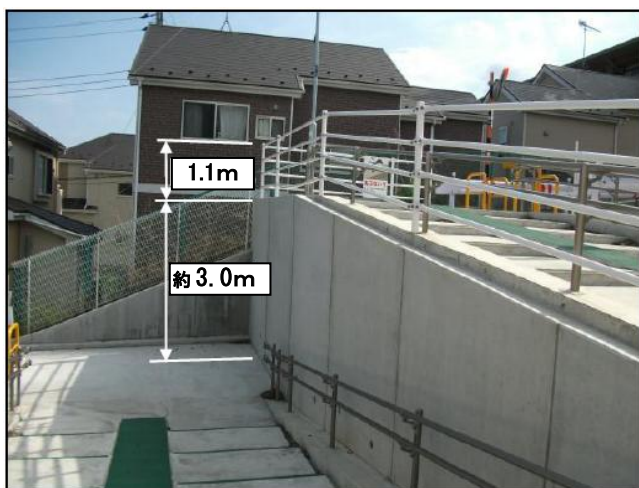

転落防止柵の状況



イ 電子成果品作成費等の積算を適正に行うべきもの

[建設局：下水道実施設計業務委託（菅田 23-2）、
下水道実施設計業務委託（緑町 23-1）]

電子納品運用ガイドラインによると、設計業務委託等については、平成20年度から電子納品対象業務とし、その費用は電子成果品作成費として積算することとされている。

また、下水道施設等の設計業務委託については、日本下水道協会の下水道用設計標準歩掛表の積算基準を準用することとしており、同積算基準によると成果品を作成するための印刷費などについては、実費を積算するとされている。

しかしながら、当該設計業務委託2件においては、電子成果品及び印刷成果品を納品させていたが、その経費が積算されていなかった。

電子成果品作成費等の積算については、電子納品運用ガイドライン等に基づき適正に行われたい。

（２）施工について改善すべき事項

ア 掘削作業における作業員の安全を確保すべきもの

[建設局：新田町村田町線側溝改良工事]

労働安全衛生規則によると、事業者は、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物に近接する箇所で掘削作業を行う場合において、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらを補強するなどの危険防止の措置が講じられた後でなければ作業を行ってはならないとされている。

しかしながら、本工事においては、側溝を布設するために、小型のパワーショベルを用いて掘削を行った後、作業員が掘削箇所の床付を行っていたところ、民地に設置されたコンクリートブロック塀に補強等を行っていなかったことから転倒し、作業員が右足を骨折する事故が発生した。

掘削作業においては、労働安全衛生規則を遵守し、作業員の安全を確保するよう受注者を指導されたい。

イ 掘削作業における作業員の安全を確保すべきもの

[建設局：新町若松町線交差点改良工事]

建設工事公衆災害防止対策要綱によると、土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、掘削の深さが1.5メートルを超える場合には、原則として、土留工を施すものとされている。

しかしながら、本工事においては、道路照明灯の基礎工事で深さ1.5メートルを超える約2.5メートルの掘削を行ったにもかかわらず、掘削面の崩落を防止するために必要とされる安全な勾配の確保や土留工の施工がされていなかった。

掘削作業においては、建設工事公衆災害防止対策要綱を遵守し、作業員の安全を確保するよう受注者を指導されたい。

別表

監査実施工事一覧表

建設局

部 名	課 名	番 号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後)
土木部	維持管理課	1	市道千葉臨海線（美浜大橋）橋梁災害復旧工事（47-1工区）	千葉市美浜区磯辺8丁目地内	107,348,850 114,161,250	H23. 8. 18 H24. 1. 14
		2	市道千葉臨海線（美浜大橋）橋梁災害復旧工事（47-2工区）	千葉市美浜区磯辺8丁目地内外1	75,962,250 79,761,150	H23. 8. 3 H24. 3. 18
		3	市道中瀬幕張町線道路災害復旧工事（11-1工区）	千葉市美浜区ひび野1丁目地内	227,505,600 248,347,050	H23. 9. 23 H24. 3. 18
		4	市道中瀬幕張町線道路災害復旧工事（11-3工区）	千葉市美浜区ひび野1丁目地内外1	120,899,100 127,557,150	H23. 9. 23 H24. 3. 18 H24. 3. 23
		5	市道海浜公園稲毛海岸線外14道路災害復旧工事（25-1工区）	千葉市美浜区稲毛海岸2丁目地内外4	62,672,400 78,786,750	H23. 10. 7 H24. 3. 18 H24. 3. 30
		6	市道新港3号線外3道路災害復旧工事（38-1工区）	千葉市美浜区新港地内	55,763,400 56,593,950	H23. 10. 20 H24. 3. 18
		7	市道幕張西27号線外5道路災害復旧工事（1-2工区）	千葉市美浜区幕張西1丁目地内外1	17,265,150 20,668,200	H23. 10. 25 H24. 3. 18
		8	（主）千葉船橋海浜線道路災害復旧工事（6-1工区）	千葉市美浜区豊砂地内	47,780,250 50,571,150	H23. 10. 28 H24. 3. 18
		9	市道磯辺111号線外8道路災害復旧工事（29-5工区）	千葉市美浜区磯辺7丁目地内外1	47,460,000	H23. 12. 23 H24. 3. 31 H24. 9. 28
	自転車対策課	10	J R 土気駅南口自転車駐車場整備工事	千葉市緑区土気町地内外	17,850,000 19,966,800	H23. 2. 19 H23. 3. 31 H23. 7. 31
		11	放置禁止区域標識等設置工事	千葉市稲毛区緑町1丁目地内外	5,953,500	H24. 1. 26 H24. 3. 18
	中央・美浜土木事務所	12	星久喜歩道橋耐震補強工事	千葉市中央区星久喜町地内	28,350,000	H23. 1. 14 H23. 3. 18 H23. 6. 30
		13	花輪町43号線道路改良工事	千葉市中央区花輪町地内外1	4,882,500	H23. 6. 28 H23. 10. 25
		14	幕張町弁天町線歩道段差解消工事	千葉市中央区弁天2丁目地内外	15,907,500 20,672,400	H23. 7. 30 H23. 11. 26 H23. 12. 28
		15	村田町34号線道路情報提供装置設置工事	千葉市中央区村田町地内	13,211,089	H23. 8. 9 H23. 12. 6
		16	千葉港5号線（問屋町地区）電線共同溝整備工事（23-1工区）	千葉市中央区千葉港地内	27,334,650 30,513,000	H23. 9. 9 H24. 2. 5
		17	幸町1号橋橋梁補修工事	千葉市美浜区幸町1丁目地内外2	80,850,000 82,083,750	H23. 10. 19 H24. 3. 18
		18	新田町村田町線側溝改良工事	千葉市中央区稲荷町3丁目地内	18,984,000 19,672,800	H23. 11. 1 H24. 3. 29
		19	富士見加曾利町線舗装改良工事	千葉市中央区道場南2丁目地内外1	41,305,950 42,544,950	H23. 11. 10 H24. 3. 18 H24. 3. 25
		20	中央赤井町線道路改良工事	千葉市中央区末広2丁目地内	50,085,000	H23. 12. 14 H24. 3. 18 H24. 6. 15

建設局

部 名	課 名	番 号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更 後)	工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後)
土木部	中央・美浜土木	21	(主) 千葉鴨川線舗装改良工事	千葉市中央区浜野町地内外 1	9,221,100	H24. 1. 26 H24. 3. 18
		22	君待橋橋梁補修工事	千葉市中央区神明町地内外 2	10,447,500	H24. 2. 1 H24. 3. 25 H24. 4. 30
		23	安全施設等設置工事 (中 2 3 - 3)	千葉市中央区新町地内外	3,045,000 3,553,200	H24. 1. 26 H24. 3. 18
	花見川・稲毛土木事務所	24	穴園第 1 歩道橋補修工事	千葉市稲毛区園生町地内	14,348,250 15,000,300	H22. 11. 5 H23. 3. 18 H23. 5. 31
		25	稲毛 7 9 号線外 1 0 (狭あい) 道路拡幅 整備工事	千葉市稲毛区稲毛 2 丁目地内外	3,004,050	H23. 6. 30 H23. 8. 28
		26	(主) 穴川天戸線 (穴川地区) 電線共同溝 整備工事 (2 3 - 1 工区)	千葉市稲毛区穴川町地内外 3	58,170,000 60,676,350	H23. 8. 24 H24. 2. 19
		27	花見川 1 号線舗装改良工事	千葉市花見川区花見川地内	16,702,350 17,169,600	H23. 9. 7 H23. 12. 15
		28	緑町 7 号線外 1 電線共同溝整備 (舗装改良) 工事	千葉市稲毛区緑町 1 丁目地内外 2	87,675,000	H23. 10. 12 H24. 3. 18 H24. 5. 31
		29	幕張本郷 7 0 号線外 1 側溝改良工事	千葉市花見川区幕張本郷 5 丁目 地内外 1	23,698,500	H23. 11. 3 H24. 3. 18
		30	宮野木町 4 2 号線交差点改良取付道路整備 工事	千葉市花見川区宮野木台 1 丁目 地内	25,158,000	H23. 11. 29 H24. 3. 18 H24. 3. 25
		31	犢橋町千種町線外 1 舗装改良工事	千葉市花見川区千種町地内外 1	16,399,950	H23. 10. 6 H24. 1. 13
		32	犢橋町 1 5 5 号線舗装改良工事	千葉市花見川区犢橋町地内	16,083,900	H23. 12. 8 H24. 3. 18
		33	作草部町 2 号線舗装道補修工事	千葉市稲毛区天台 4 丁目地内外 1	9,076,200	H24. 1. 26 H24. 3. 25
		34	浪花橋補修工事	千葉市花見川区浪花町地内	13,177,500	H24. 1. 20 H24. 3. 25 H24. 5. 31
		35	犢橋町 1 3 号線外 2 道路照明灯設置工事	千葉市花見川区花見川地内外 4	3,895,500	H24. 1. 25 H24. 3. 18
	若葉土木事務所	36	(主) 千葉川上八街線舗装道補修工事 (小間子工区)	千葉市若葉区小間子町地内外	10,867,500 11,020,800	H23. 7. 2 H23. 9. 19
		37	桜木町 1 3 号線道路情報提供装置設置工事	千葉市若葉区桜木北 1 丁目地内 外 1	13,371,750	H23. 7. 5 H23. 11. 1
		38	原町 9 1 号線外 1 舗装改良工事	千葉市若葉区原町地内外 2	16,365,300 17,266,200	H23. 7. 13 H23. 10. 10
		39	根崎橋耐震補強工事	千葉市若葉区東寺山町地内外 1	234,045,000	H23. 10. 21 H24. 3. 18 H24. 4. 20
		40	(一) 岩富山田台線道路改良工事	千葉市若葉区小間子町地内	15,747,900	H23. 11. 22 H24. 3. 18

※ 中央・美浜土木：中央・美浜土木事務所

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更 後)	工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後)
土木部	若葉土木事務所	41	萩台町73号線舗装改良工事	千葉市若葉区源町地内外1	23,436,000 23,721,600	H23. 12. 20 H24. 3. 18
		42	太田橋外3橋梁補修工事	千葉市若葉区太田町地内外4	7,623,000	H24. 1. 26 H24. 3. 18
		43	安全施設等設置工事（若23－2）	千葉市若葉区野呂町地内外	5,796,000 6,071,100	H24. 1. 26 H24. 3. 18 H24. 3. 25
		44	都賀駅大草町線歩道段差解消工事 （千城台西1丁目工区）	千葉市若葉区千城台西1丁目地内 外3	23,730,000	H24. 1. 27 H24. 3. 18 H24. 5. 31
	緑土木事務所	45	安全施設等設置工事（緑23－1）	千葉市緑区おゆみ野南6丁目地内 外	2,595,600 2,661,750	H23. 6. 11 H23. 9. 8
		46	塩田町菅田町線舗装道補修工事	千葉市緑区おゆみ野中央5丁目 地内外2	14,701,050 14,922,600	H23. 6. 23 H23. 10. 20
		47	（主）千葉大綱線（鎌取工区）歩道整備 工事	千葉市緑区鎌取町地内	59,703,000 59,738,700	H23. 9. 6 H24. 3. 18
		48	大木戸町58号線道路整備工事	千葉市緑区大木戸町地内	16,107,000 16,432,500	H23. 11. 17 H24. 3. 18
		49	（一）土気停車場金剛地線舗装改良工事	千葉市緑区板倉町地内	16,905,000 17,204,250	H23. 11. 23 H24. 3. 18
		50	なかのみち橋補修工事	千葉市緑区おゆみ野中央5丁目 地内	19,477,500	H24. 1. 26 H24. 3. 31 H24. 5. 31
土木部 小計				50件	1,857,945,589	
道路部	道路建設課	51	鎌取町28号線外2道路改良工事	千葉市緑区鎌取町地内外1	40,899,600 41,386,800	H22. 11. 25 H23. 3. 18 H23. 7. 15
		52	さつきが丘第一保育所駐車場設置工事	千葉市花見川区さつきが丘2丁目 32番1号	12,540,150 13,589,100	H23. 10. 21 H24. 1. 28
		53	菅田町215号線電線共同溝整備工事 （23－1工区）	千葉市緑区菅田町2丁目地内	42,420,000	H23. 11. 9 H24. 3. 16
		54	仁戸名町古市場町線道路新設工事 （23－2）	千葉市緑区古市場町地内外2	54,661,950	H23. 11. 9 H24. 3. 16 H24. 5. 31
		55	（主）浜野四街道長沼線（更科2工区） 道路新設工事（23－2）	千葉市若葉区更科町地内	147,840,000	H23. 12. 8 H24. 3. 16 H24. 7. 31
		56	千葉市立緑町小学校改築外構工事 （その1）	千葉市稲毛区緑町2丁目13番 1号	63,644,700	H23. 12. 23 H24. 8. 18
		57	菅田町215号線舗装工事	千葉市緑区菅田町2丁目地内	15,363,600	H24. 1. 20 H24. 3. 16 H24. 7. 31
	街路建設課	58	新町若松町線交差点改良工事	千葉市若葉区都賀1丁目地内外	72,975,000 73,903,200	H23. 2. 5 H23. 3. 31 H24. 3. 28
		59	源町大森町線街路築造工事	千葉市若葉区貝塚2丁目地内	27,857,550 32,563,650	H23. 3. 24 H23. 10. 9 H23. 12. 28
		60	新港横戸町線E斜路製作架設外工事	千葉市稲毛区黒砂3丁目地内外	98,700,000 103,236,000	H23. 2. 2 H23. 3. 31 H23. 12. 15

建設局

部 名			課 名	番 号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更 後)	工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後)
道 路 部	街 路 建 設 課	61	新港横戸町線 5 工区副道整備工事	千葉市稲毛区穴川 1 丁目地内外	160,345,500 188,693,400	H23. 3. 31 H23. 12. 5 H24. 2. 29		
		62	新港横戸町線 5 ・ 6 工区副道外整備工事	千葉市稲毛区黒砂台 3 丁目地内外	174,825,000 193,129,650	H23. 8. 5 H24. 3. 18 H24. 3. 25		
		63	新港横戸町線 6 工区遮音壁設置工事	千葉市稲毛区穴川 4 丁目地内	13,986,000	H23. 9. 29 H24. 1. 26		
		64	新港横戸町線 E 公園擁壁築造工事	千葉市稲毛区黒砂 3 丁目地内	57,085,350 57,750,000	H23. 9. 9 H24. 3. 18		
		65	美浜長作町線擁壁工事	千葉市花見川区武石町 1 丁目地内	55,973,400 55,256,250	H23. 9. 9 H24. 3. 18		
		道 路 部 小 計				1 5 件	1,039,117,800	
下 管 部	維 持	66	草野水のみち警報施設設置工事	千葉市稲毛区稲毛町 5 丁目地内外	18,935,700 19,034,400	H23. 7. 20 H23. 10. 27 H23. 11. 16		
下 水 道 管 理 部 小 計				1 件	18,935,700			
下 水 道 建 設 部	下 水 道 建 設 課	67	下水道排水施設工事 (長洲 2 3 - 2 工区)	千葉市中央区長洲 1 丁目地内外 1	253,081,500 263,330,550	H23. 6. 7 H24. 3. 18 H24. 5. 31		
		68	下水道災害復旧工事 (2 3 災下第 1 号)	千葉市美浜区浜田 2 丁目地内	68,079,900 68,339,250	H23. 8. 9 H24. 2. 24 H24. 3. 13		
		69	下水道災害復旧工事 (2 3 災下第 5 号その 1)	千葉市美浜区磯辺 7 丁目地内	85,151,850	H23. 8. 19 H24. 3. 13 H24. 4. 27		
		70	下水道雨水浸透施設工事 (弥生 2 3 - 1)	千葉市稲毛区弥生町地内	10,305,750 10,279,500	H23. 9. 14 H24. 1. 11		
		71	下水道排水施設工事 (高品雨水 1 号幹線 2 3 - 1 工区)	千葉市若葉区高品町地内	60,165,000	H23. 12. 14 H24. 3. 13 H24. 6. 29		
		72	下水道排水施設工事 (富士見 2 3 - 1 工区)	千葉市中央区富士見 2 丁目地内外 1	115,710,000	H23. 10. 29 H24. 3. 13 H24. 7. 31		
		73	下水道排水施設工事 (幕張 2 3 - 1 工区)	千葉市花見川区幕張町 6 丁目地内外 2	10,021,200 10,777,200	H23. 11. 3 H24. 3. 11		
		74	舗装復旧工事 (若葉 2 3 - 1)	千葉市若葉区佐和町地内外 5	11,102,700	H23. 11. 22 H24. 2. 19		
	下 水 道 再 整 備 課	75	マンホールトイレ設置工事 (2 3 - 1 工区)	千葉市美浜区打瀬 1 丁目地内外 2	3,748,500 3,922,800	H23. 11. 15 H24. 2. 12		
		76	下水道災害復旧工事 (2 3 災下第 3 号)	千葉市美浜区真砂 4 丁目地内外	16,779,000 20,804,700	H23. 8. 12 H24. 2. 27 H24. 3. 23		
		77	下水道災害復旧工事 (2 3 災下第 8 号)	千葉市美浜区磯辺 1 丁目地内外	53,006,100	H23. 8. 13 H24. 3. 13 H24. 4. 27		
		78	下水道施設改良工事 (弁天 2 3 - 1 工区)	千葉市中央区弁天 2 丁目地内外 1	83,685,000	H23. 11. 2 H24. 3. 13		
		79	下水道施設改良工事 (大宮台 2 3 - 1 工区)	千葉市若葉区大宮台 2 丁目地内外 2	41,559,000 41,637,750	H23. 11. 9 H24. 3. 13		
		80	下水道施設移設工事 (幸 2 3 - 1 工区)	千葉市美浜区幸町 2 丁目地内外 1	117,127,500	H23. 12. 28 H24. 10. 31		

※ 下管部：下水道管理部 維持：下水道維持課

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更 後)	工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後)
下水道建設部	下水道再整備課	81	下水道施設改良工事 (小倉台２３－１工区)	千葉市若葉区小倉台５丁目地内外２	36,540,000	H23.12.16 H24. 3.13 H24. 5.31
		82	下水道施設改良工事 (末広２３－２工区)	千葉市中央区末広１丁目地内	119,241,150	H24. 1.20 H24. 3.13 H24. 8.31
		83	人孔蓋更新工事 (２３－２工区)	千葉市中央区神明町地内外	15,235,500	H24. 2. 1 H24. 3.18 H24. 5.31
	下水道施設建設課	84	南部浄化センター汚泥消化タンク建設工事	千葉市中央区村田町８９３番地内	380,520,000 393,071,700	H22.11. 5 H23.12.29 H24. 3.23
		85	中央浄化センター電気設備改築更新工事	千葉市美浜区新港６９番地	1,161,915,300	H22.11. 5 H24. 3.13
		86	中央雨水ポンプ場場内整備工事その２	千葉市中央区中央港１丁目 ２１１番地内外	29,715,000 29,731,800	H23. 7.28 H23.11.24
		87	ひび野ポンプ場非常用発電機設備更新工事	千葉市美浜区ひび野２丁目 １１３番	119,889,000	H23. 9.21 H24. 3.13
		88	南部浄化センターＣ系管廊建設工事その１	千葉市中央区村田町８９３番地内	134,610,000 142,363,200	H23. 9.14 H24. 3.13 H24. 3.26
		89	南部浄化センターＡ系最初沈殿池機械設備更新工事	千葉市中央区浜野町１０２５番地内	116,329,500	H23. 9.29 H24. 3.13
		90	中央浄化センター最終沈殿池採泥機機械設備更新工事	千葉市美浜区新港６９番地	240,450,000	H23.10.15 H24. 3.13 H24. 7.31
		91	南部浄化センター砂ろ過電気設備更新工事	千葉市中央区村田町８９３番地内	66,843,000	H23.11.16 H24. 3.13 H24. 6.30
		92	南部浄化センター砂ろ過機械設備更新工事	千葉市中央区村田町８９３番地内	118,650,000	H23.11.16 H24. 3.13 H24. 7.31
		都市河川課	93	一級河川勝田川河道築造工事 (２３－２工区)	千葉市花見川区宇那谷町地内外１	32,865,000
	94		排水施設新設工事 (辺田排水路２３－１工区)	千葉市緑区辺田町地内外１	23,215,500 23,695,350	H23.10. 7 H24. 2.13
	95		排水施設新設工事 (千種町２３－１工区)	千葉市花見川区千種町地内	30,642,150	H23.11. 2 H24. 3.18
	96		加曽利中学校流域貯留浸透施設整備工事	千葉市若葉区加曽利町地内	12,458,250	H23.10.29 H24. 3.18
	97		急傾斜地崩壊防止工事 (園生町２３－１工区)	千葉市稲毛区園生町地内	15,976,800	H23.11.16 H24. 3.18
	98		東寺山調整池整備工事	千葉市若葉区東寺山町地内外１	3,480,750 3,534,300	H23.12.28 H24. 3.18
下水道建設部 小計				３４件	3,588,099,900	
建設局				９８件	6,504,098,989	

水道局

部 名	課 名	番 号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更 後)	工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後)
一	水道施設課	99	配水管布設工事（２３－１工区）	千葉市若葉区川井町地内外１	76,335,000	H23. 9. 28 H24. 3. 16
		100	舗装本復旧工事（２３－１工区）	千葉市若葉区中田町地内外１	19,456,500	H23. 12. 1 H24. 3. 16
水道局				２件	95,791,500	

別表

監査実施業務委託一覧表

建設局

部名	課名	番号	委 託 名	委託箇所	契約金額(円) (下段：変更 後)	期 間 (上段：自 中段：至 下段：変更後)
土 木 部	中央・美浜土木事務所	1	中浜橋外 1 補修実施設計業務委託	千葉市美浜区中瀬 1 丁目地内外 3	4,612,650 6,119,400	H23. 9. 8 H24. 3. 18 H24. 3. 31
		2	栄町 1 号線電線共同溝実施設計業務委託	千葉市中央区栄町地内外 1	23,572,500 30,623,250	H23. 9. 1 H24. 3. 18 H24. 3. 25
		3	末広 3 号橋外 1 補修実施設計業務委託	千葉市中央区末広 2 丁目地内外 2	2,956,800	H23.10. 1 H24. 1. 8
		4	メッセ大橋歩道橋外 2 補修実施設計業務委託	千葉市美浜区豊砂地内外 3	5,250,000	H23.12.15 H24. 3. 18
	花見川・稲毛土木	5	幕張本郷 7 0 号線外 7 道路実施設計業務委託	千葉市花見川区幕張本郷 5 丁目地内外 6	2,324,700	H23. 6. 3 H23. 9. 30
		6	小中台高架橋 2 号耐震補強実施設計業務委託	千葉市稲毛区小仲台 8 丁目地内外 1	7,295,400	H23. 8. 9 H24. 1. 5
		7	(主) 長沼船橋線外 2 道路実施設計業務委託	千葉市花見川区犢橋町地内外 2	1,421,700	H24. 1. 25 H24. 3. 18
	若葉土木事務所	8	小倉台 1 3 7 号線外 5 道路実施設計業務委託	千葉市若葉区小倉台 7 丁目地内外 2	1,180,200	H23. 6. 16 H23. 8. 14
		9	中野町 2 6 4 号線外 1 道路実施設計業務委託	千葉市若葉区中野町地内外 1	868,350	H23. 7. 14 H23. 9. 11
		10	西都賀 5 3 号線外道路実施設計業務委託	千葉市若葉区西都賀 1 丁目地内外	979,650	H24. 1. 25 H24. 3. 18
	緑土木事務所	11	中芝台 2 号橋外 2 補修設計業務委託	千葉市緑区おゆみ野 3 丁目地内外 2	3,816,750	H23. 9. 1 H23.12. 9
		12	指定道路高津戸町 1 1 号線外道路実施設計業務委託	千葉市緑区高津戸町地内	4,171,650	H23.10. 6 H24. 3. 3
		13	古市場町高田町線外 5 道路実施設計業務委託	千葉市緑区高田町地内外 3	2,973,600 3,239,250	H23.10. 6 H24. 3. 3 H24. 3. 23
		14	(主) 千葉大網線 (大木戸新田交差点) 土質調査業務委託	千葉市緑区大高町地内	1,375,500	H23.12.20 H24. 3. 25
土木部 小計				1 4 件	62,799,450	
道 路 部	道路建設課	15	(主) 千葉大網線 (ニューサンピア千葉交差点) 道路詳細設計業務委託	千葉市中央区仁戸名町地内	2,946,300 3,246,600	H23. 7. 21 H24. 3. 26
		16	三角町柏井町線 (柏井橋) 橋梁詳細設計業務委託	千葉市花見川区柏井町地内	30,252,600	H23. 9. 28 H24. 3. 18 H24. 6. 29
		17	千葉市緑町小学校改築外構工事監理業務委託	千葉市稲毛区緑町 2 丁目 1 3 番 1 号	12,600,000	H24. 1. 21 H25. 2. 28
		18	三角町柏井町線 (柏井橋) 地質調査業務委託	千葉市花見川区柏井町地内	4,672,500 5,038,950	H23.12.22 H24. 3. 20
	街路建設課	19	市営住宅高浜団地内通路等災害復旧実施設計業務委託	千葉市美浜区高浜 1 丁目 2 番外 3	8,260,350 14,621,250	H23. 9. 8 H23.12.16 H24. 1. 13
		20	新港横戸町線緑道実施設計業務委託	千葉市稲毛区黒砂台 3 丁目地内外	5,344,500	H23.10. 7 H24. 3. 30
道路部 小計				6 件	64,076,250	

※ 花見川・稲毛土木：花見川・稲毛土木事務所

建設局

部 名	課 名	番 号	委 託 名	委託箇所	契約金額(円) (下段：変更 後)	期 間 (上段：自 中段：至 下段：変更後)
下水道建設部	下水道建設課	21	下水道実施設計業務委託 (高品雨水1号幹線23-1)	千葉市若葉区高品町地内	5,006,400	H23. 6. 8 H23.10. 5
		22	下水道実施設計業務委託 (松波23-1)	千葉市中央区松波1丁目地内外2	13,301,400 12,821,550	H23.11.17 H24. 3.18
		23	土質調査業務委託 (松波23-1)	千葉市中央区松波1丁目地内外1	1,522,500 1,701,000	H24. 1.25 H24. 3.24
	再整備	24	下水道実施設計業務委託 (菅田23-2)	千葉市緑区菅田町3丁目地内外1	3,370,500	H23. 9.23 H24. 1.20
		25	下水道実施設計業務委託 (緑町23-1)	千葉市稲毛区緑町1丁目地内外1	10,034,850	H23.10.26 H24. 3.16
	下水道施設建設課	26	幸ポンプ場外2耐震補強実施設計業務委託	千葉市美浜区幸町2丁目4番地内外2	10,395,000	H23. 9.14 H24. 3.13
		27	南部浄化センター電気設備更新実施設計業務委託	千葉市中央区村田町893番地内	19,787,250	H23. 9. 6 H24. 3.13
		28	工事監督業務委託 (汚泥消化タンク)	千葉市中央区村田町893番地内	4,515,000	H23. 4. 1 H23.12.29 H24. 3.23
	都市河川課	29	排水施設実施設計業務委託 (宇那谷調整池23-1)	千葉市花見川区宇那谷町地内外	5,838,000	H23. 8.25 H24. 1.21
		30	二級河川坂月川軟弱地盤解析業務委託	千葉市若葉区太田町地内外1	5,880,000	H24. 1.19 H24. 3.18
下水道建設部 小計				10件	79,650,900	
建設局				30件	206,526,600	

※ 再整備：下水道再整備課
