

平成25年度
監 査 報 告 書
(I)

第 1 期 工 事 定 期 監 査 結 果 報 告

千葉市監査委員

25 監査報告第9号
平成25年11月1日

千葉市議会議長 宇留間 又衛門 様
千葉市長 熊谷 俊人 様

千葉市監査委員 宮 下 公 夫
同 宮 原 清 貴
同 黒 宮 昇
同 石 橋 毅

地方自治法第199条第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を提出します。

第1期工事定期監査結果報告

1 監査の対象

建設局、水道局

2 監査の範囲

平成24年度に実施した工事及び業務委託

3 監査の期間

平成25年4月1日から平成25年10月28日まで

4 監査の方法

今回の監査は、監査対象工事405件のうちから抽出した別表に掲げる監査実施工事100件、監査対象業務委託102件のうちから抽出した別表に掲げる監査実施業務委託30件について、工事及び業務委託が設計、積算、契約、施工等の各段階において、技術面から適正に行われているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の視点にも留意して、設計図面、仕様書、設計書、契約書、施工計画書、工事記録写真、品質報告書等の関係書類を調査するとともに、関係職員から説明を聴取し、実地調査を行った。

<主な着眼点>

(1) 設計・積算

- ・ 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。
- ・ 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。
- ・ 高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。
- ・ 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。
- ・ 歩掛及び単価は適正か。また、諸経費は適切に算出されているか。

(2) 契約

- ・ 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。
- ・ 契約の履行期限は守られているか。
- ・ 追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内容は適切か。また、事務は適時、かつ適切に行われているか。

(3) 施工・検査

- ・ 工事施工計画は適切か。
- ・ 設計図書どおり施工されているか。
- ・ 法令等を遵守して施工されているか。
- ・ 各種承諾図書、工事記録写真等の受注者提出書類は整備されているか。
- ・ 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。
- ・ 安全管理、工程管理及び品質管理は適切に行われているか。

5 監査の結果

監査の対象局における工事及び業務委託のうち、契約、検査については、おおむね適正に執行されていたが、設計・積算、施工について次のとおり改善すべき事項が認められた。

(1) 設計・積算について改善すべき事項

ア 視覚障害者誘導用ブロックの設置を適正に行うべきもの

[建設局：都賀駅大草町線外特定経路整備工事（都賀工区）、
大木戸町土気町線外10歩道段差解消工事]

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）に基づく道路の移動等円滑化基準の整備ガイドラインによると、「特定道路等においては、歩道等の横断歩道接続部等に、点状ブロックによる歩車道境界の注意喚起を行うとともに、線状ブロックによりその移動方向を示す視覚障害者誘導用ブロックを部分的に設置するものとする。」とされている。


また、千葉市内における歩行空間の整備の指針となることを目的として作成された歩行空間整備マニュアルによると、視覚障害者誘導用ブロックの設置の考え方について、「線状ブロックで、横断歩道上の歩行方向及び横断歩道の中心部を案内する。」とされ、「点状ブロックで、対面方向から、横断歩道を渡ってきた視覚障害者の官民境界にある塀や建物への衝突を防止する。」とされている。

しかしながら、都賀駅大草町線外特定経路整備工事（都賀工区）においては、横断歩道接続部に設置した線状ブロックが、横断歩道の中心部を案内していなかった。

また、大木戸町土気町線外10歩道段差解消工事においては、対面方向から横断歩道を渡ってきた視覚障害者が、民地にある塀等に衝突することを防止する点状ブロックが設置されていなかった。

視覚障害者誘導用ブロックの設置については、道路の移動等円滑化基準の整備ガイドライン等に基づき適正に行われたい。

現場の状況写真

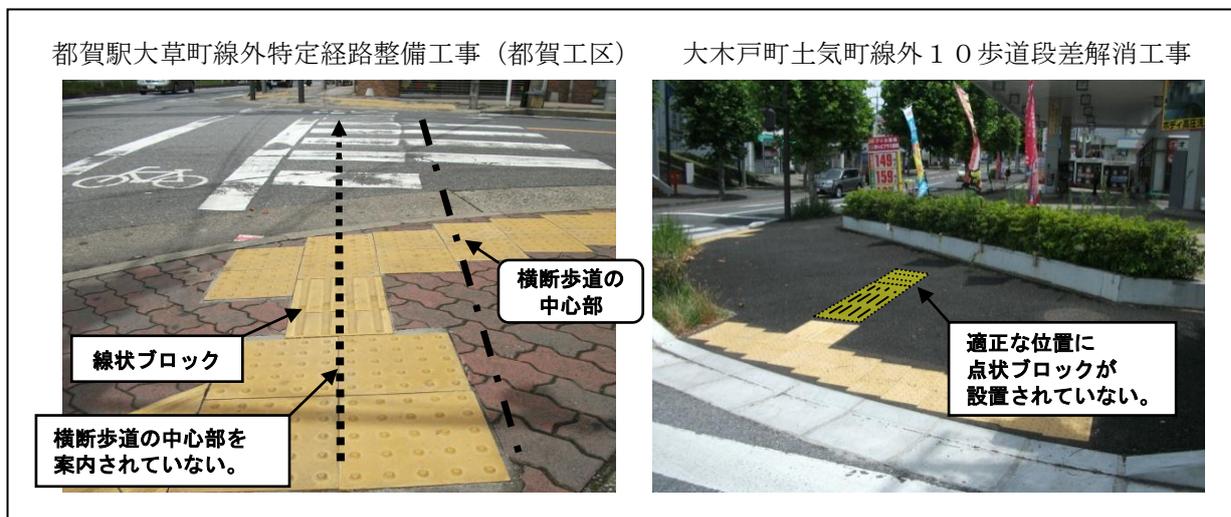

イ LED照明灯具の材料費に係る諸経費を適正に積算すべきもの

[建設局：おゆみ野中央778号線外1道路照明灯設置工事、
仁戸名町古市場町線道路新設工事(24-1)]

「LED道路照明灯の導入について」(平成23年10月28日付け土木部長通知)によると、新規にLED道路照明灯を設置する場合の設計基準等については、「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)」を準用するものとされている。これにより、道路照明灯設置工事における、LED照明灯具の材料費に係る諸経費については、共通仮設費を対象外とし、積算することとなっている。

しかしながら、当該工事2件においては、LED照明灯具の材料費に係る諸経費に共通仮設費を計上していた。

LED照明灯具の材料費に係る諸経費については、通知に基づき適正に積算されたい。

ウ 材料の運搬に係る費用を適正に積算すべきもの

[建設局：千葉市立緑が丘中学校防球ネット設置工事]

土木工事積算基準によると、工事を施工するための材料費の設計単価には、原則として、購入場所から現場までの運賃を含むものとされている。

しかしながら、本工事においては、防球ネットを支えるコンクリートポールについて、材料費以外に購入場所から現場までの運賃を別途計上していた。

材料の運搬に係る費用については、土木工事積算基準に基づき適正に積算されたい。

(2) 施工について改善すべき事項

ア グレーチング蓋の盗難対策を適正に行うべきもの


[建設局：都町163号線外2側溝新設工事]

「グレーチング蓋の仕様について」(平成20年10月29日付け土木部長通知)によると、道路側溝などに設置するグレーチング蓋については、盗難対策として、千葉市の所有であることを明確にするための刻印を側面に施すとともに、グレーチング蓋1枚に対して盗難防止金具を2か所設置することとされている。

しかしながら、本工事においては、新設の道路側溝に設置したグレーチング蓋について、千葉市の所有物であることを明確にするための刻印は施されているものの、盗難防止金具が設置されていなかった。

グレーチング蓋の盗難対策については、通知に基づき適正に行われたい。

(1) 刻印及び盗難防止金具の設置例

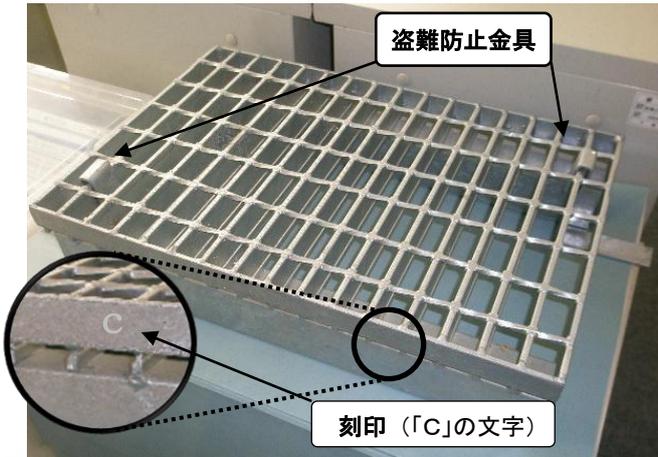

(2) 現場の状況写真



別表

監査実施工事一覧表

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後)
土木部	維持管	1	市道打瀬6号線外6道路災害復旧工事 (単-9工区)	千葉市美浜区打瀬2丁目地内外5	5,460,000 5,045,250	H24. 6. 6 H24. 9. 13
		自転車 対策課	2	大森台駅外自転車駐車場機械設備工事	千葉市中央区大森町地内外	4,410,000 4,497,150
	3		新港穴川線自転車専用通行帯整備工事	千葉市稲毛区黒砂3丁目地内外	21,210,000 21,631,050	H24. 12. 4 H25. 3. 18
	4		東寺山町107号線外5側溝改良工事	千葉市中央区東千葉2丁目地内	52,647,000 55,752,900	H23. 12. 20 H24. 6. 30
	中央・ 美浜土 木事務所	5	末広地下道昇降階段補修工事	千葉市中央区稲荷町3丁目地内 外1	11,550,000 11,466,000	H24. 3. 22 H24. 7. 19
		6	南町大森町線外特定経路整備工事	千葉市中央区南町2丁目地内	49,337,400 47,349,750	H24. 3. 22 H24. 9. 17
		7	弁天31号線道路改良工事	千葉市中央区弁天2丁目地内	12,569,550 13,948,200	H24. 7. 14 H24. 10. 11 H24. 11. 30
		8	亀岡橋外1橋梁補修工事	千葉市中央区亀岡町地内外3	11,760,000 14,311,500	H24. 7. 31 H24. 11. 27
		9	都町163号線外2側溝新設工事	千葉市中央区都町地内外	2,646,000	H24. 9. 25 H24. 12. 3
		10	高品町177号線舗装改良工事	千葉市中央区東千葉2丁目地内	10,929,450 11,851,350	H24. 9. 29 H25. 1. 6 H25. 1. 21
		11	安全施設等設置工事(中24-2)	千葉市中央区松波2丁目地内外	10,466,400 11,053,350	H24. 10. 10 H25. 1. 7 H25. 1. 31
		12	(主)千葉船橋海浜線舗装改良工事	千葉市美浜区浜田2丁目地内外1	27,300,000 27,497,400	H24. 10. 20 H25. 2. 16
		13	海浜公園稲丘町線外2舗装改良工事	千葉市美浜区稲毛海岸2丁目地内 外2	59,010,000 68,735,100	H24. 10. 25 H25. 2. 21
		14	新田町32号線歩道整備工事	千葉市中央区新田町地内外2	65,362,500	H24. 11. 2 H25. 3. 18 H25. 10. 31
		15	西千葉駅稲荷町線(末広5丁目)交差点 改良工事	千葉市中央区末広5丁目地内外2	35,070,000 39,608,100	H24. 11. 23 H25. 3. 18 H25. 3. 25
		16	西千葉駅稲荷町線(末広5丁目)交差点 改良工事に伴う信号機移設工事	千葉市中央区末広5丁目地内外2	5,323,500 5,384,400	H24. 12. 4 H25. 3. 18
		17	南生実町37号線外2側溝改良工事	千葉市中央区南生実町地内	7,176,750 8,490,300	H24. 12. 29 H25. 3. 18
		18	(主)千葉大綱線(松ヶ丘町地区)舗装 改良工事	千葉市中央区松ヶ丘町地内外1	41,874,000 43,796,550	H25. 1. 18 H25. 3. 18 H25. 4. 30
		19	蘇我跨線橋耐震補強工事	千葉市中央区今井1丁目地内	116,182,500	H25. 1. 26 H25. 10. 22
		花・ 稲	20	(主)穴川天戸線(穴川地区)電線共同溝 整備工事(23-2工区)	千葉市稲毛区穴川3丁目地内	38,181,150 39,798,150

※ 維持管：維持管理課 花・稲：花見川・稲毛土木事務所

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期	
						上段：自	中段：至 下段：変更後
土木部	花見川・稲毛土木事務所	21	小中台高架橋2号橋梁耐震補強工事	千葉市稲毛区小仲台8丁目地内外1	102,900,000 105,353,850	H24. 3. 23 H24. 10. 18	
		22	畑町4号線道路改良工事	千葉市花見川区畑町地内	11,374,650 13,811,700	H24. 7. 4 H24. 10. 31	
		23	安全施設等設置工事(花24-1)	千葉市花見川区朝日ヶ丘2丁目地内外	2,680,650 3,221,400	H24. 7. 14 H24. 10. 11	
		24	幕張本郷9号線外1側溝改良工事	千葉市花見川区幕張本郷7丁目地内	14,248,500 13,409,550	H24. 7. 18 H24. 11. 24	
		25	穴川犢橋町線外3道路照明灯設置工事	千葉市稲毛区園生町地内外	3,675,000 4,042,500	H24. 7. 31 H24. 10. 28	
		26	犢橋町6号線歩道整備工事	千葉市花見川区千種町地内	33,127,500 33,233,550	H24. 8. 3 H25. 1. 29	
		27	犢橋町7号線舗装改良工事	千葉市花見川区犢橋町地内外2	3,764,250 4,882,500	H24. 8. 4 H24. 10. 22	
		28	犢橋町13号線舗装道補修工事	千葉市花見川区花見川地内外2	5,185,950	H24. 8. 11 H24. 10. 9	
		29	幕張町線舗装改良工事	千葉市花見川区幕張本郷2丁目地内外1	13,633,200 17,215,800	H24. 8. 21 H24. 11. 28	
		30	横戸町73号線舗装改良工事	千葉市花見川区横戸町地内	8,091,300 8,778,000	H24. 10. 30 H25. 1. 27	
		31	長作町223号線道路改良工事	千葉市花見川区武石町1丁目地内	8,505,000 9,163,350	H24. 11. 10 H25. 2. 27	
		32	宮野木町108号線道路改良工事	千葉市稲毛区宮野木町地内	74,503,800 76,519,800	H24. 12. 21 H25. 8. 17	
		33	鉄砲塚跨線橋補修工事	千葉市花見川区幕張本郷2丁目地内外1	46,305,000	H25. 1. 26 H25. 8. 23 H25. 12. 27	
	若葉土木事務所	34	千城台2号線外2側溝改良工事	千葉市若葉区千城台西1丁目地内	11,877,600 12,547,500	H24. 7. 10 H24. 11. 6 H24. 12. 6	
		35	都賀駅大草町線特定経路整備工事(千城台南工区)	千葉市若葉区千城台南1丁目地内外	39,863,250 41,428,800	H24. 7. 19 H24. 12. 5 H25. 1. 31	
		36	(主) 千葉川上八街線外1舗装改良工事	千葉市若葉区金親町地内外1	14,095,200	H24. 8. 25 H24. 11. 22	
		37	(主) 千葉白井印西線舗装改良工事	千葉市若葉区若松町地内外	12,755,400	H24. 9. 5 H24. 11. 23	
		38	(一) 誉田停車場中野線舗装改良工事	千葉市若葉区中野町地内	12,650,400 12,711,300	H24. 9. 27 H24. 12. 15 H25. 1. 24	
		39	安全施設等設置工事(若24-2)	千葉市若葉区若松町地内外	3,957,450 4,602,150	H24. 11. 17 H25. 2. 4	
		40	都賀駅大草町線外特定経路整備工事(都賀工区)	千葉市若葉区都賀3丁目地内外	10,305,750 9,697,800	H24. 12. 28 H25. 3. 18 H25. 3. 29	

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後)
土木部	若葉土木事務所	41	原陸橋補修工事	千葉市若葉区原町地内外 3	20,790,000 25,613,700	H25. 1. 18 H25. 5. 31
		42	(主) 千葉川上八街線市営住宅補償工事	千葉市若葉区千城台東 4 丁目地内	10,391,850 10,966,200	H25. 1. 22 H25. 3. 18 H25. 3. 25
		43	金親町 2 5 号線外 1 側溝新設工事	千葉市若葉区金親町地内	5,523,000	H25. 1. 23 H25. 3. 18
	緑土木事務所	44	中芝台 2 号橋外 1 補修工事	千葉市緑区おゆみ野 3 丁目地内外 1	14,246,400	H24. 3. 22 H24. 7. 19
		45	塩田町誉田町線舗装改良工事	千葉市緑区おゆみ野中央 5 丁目地内外 1	24,129,000 27,030,150	H24. 7. 13 H24. 11. 9
		46	高津戸町 9 号線外 2 側溝改良工事	千葉市緑区高津戸町地内	18,970,350 19,458,600	H24. 8. 8 H25. 1. 4
		47	中芝橋補修外工事	千葉市緑区高田町地内	24,360,000 24,584,700	H24. 9. 29 H25. 3. 17
		48	下大和田町 3 4 号線外 1 舗装改良工事	千葉市緑区下大和田町地内	8,829,450	H24. 10. 31 H25. 2. 17
		49	大木戸町土気町線外 1 0 歩道段差解消工事	千葉市緑区あすみが丘 1 丁目地内外 7	12,757,500 13,269,900	H24. 11. 8 H25. 3. 18
		50	おゆみ野中央 7 7 8 号線外 1 道路照明灯設置工事	千葉市緑区おゆみ野中央 3 丁目地内外 1	1,050,000	H24. 12. 11 H25. 3. 10
土木部 小計				50 件	1,163,013,600	
道路部	道路建設課	51	(主) 浜野四街道長沼線 (更科 2 工区) 道路新設工事 (2 3 - 2)	千葉市若葉区更科町地内	147,840,000 151,237,800	H23. 12. 8 H24. 3. 16 H24. 7. 31
		52	千葉市立松ヶ丘中学校改築外構工事	千葉市中央区松ヶ丘町 4 4 0 番地	175,297,500 199,916,850	H23. 12. 14 H25. 3. 18
		53	仁戸名町平山町線 (第二工区) 道路改良工事	千葉市中央区仁戸名町地内	48,300,000 48,559,350	H24. 2. 1 H24. 3. 31 H24. 7. 31
		54	千葉市営住宅宮野木町第 1 団地第二期建替事業造成工事 (その 2)	千葉市稲毛区宮野木町地内	69,195,000 71,046,150	H24. 8. 23 H25. 2. 18 H25. 3. 18
		55	(主) 浜野四街道長沼線 (下田大橋) 下部工工事 (その 1)	千葉市若葉区下田町地内外 1	157,500,000 158,279,100	H24. 9. 28 H25. 3. 18 H25. 6. 28
		56	千葉市立緑が丘中学校防球ネット設置工事	千葉市花見川区犢橋町 2 1 3 番地の 4	10,605,000 11,059,650	H24. 10. 11 H25. 1. 8
		57	誉田駅北口線下水道排水施設工事 (2 4 - 1 工区)	千葉市緑区誉田町 2 丁目地内	12,606,300 11,448,150	H24. 11. 15 H25. 3. 14
		58	仁戸名町古市場町線道路新設工事 (2 4 - 1)	千葉市緑区椎名崎町地内	64,050,000 62,171,550	H24. 11. 22 H25. 3. 18 H25. 6. 30
	街路建設課	59	美浜長作町線街路築造工事	千葉市花見川区武石町 1 丁目地内	139,440,000 159,039,300	H24. 3. 22 H24. 11. 16 H25. 3. 18
		60	黒砂橋 (1 3 号橋) 脇歩道橋設置工事	千葉市美浜区幸町 2 丁目地内外	59,850,000 60,195,450	H24. 9. 14 H25. 3. 18

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後)
道路部	街路建設課	61	新港横戸町線緑地C（仮称）緑道整備工事	千葉市稲毛区黒砂台3丁目地内外	68,707,800 71,029,350	H24. 9. 28 H25. 3. 18
		62	新港横戸町線緑地B（仮称）緑道整備工事	千葉市稲毛区黒砂台2丁目地内	14,617,050 16,623,600	H24. 10. 23 H25. 3. 18
		63	黒砂台1号線交差点改良工事	千葉市稲毛区黒砂台3丁目地内	10,779,300 10,545,150	H24. 11. 27 H25. 3. 16
		64	千葉市営住宅高浜第2団地災害復旧工事	千葉市美浜区高浜1丁目5番	102,963,000 114,604,350	H24. 3. 22 H24. 10. 27
		65	千葉市営住宅高浜第3団地災害復旧工事	千葉市美浜区高浜4丁目2番	47,008,500 49,427,700	H24. 3. 23 H24. 9. 8 H24. 9. 28
道路部 小計				15件	1,128,759,450	
下水道管理部	下水道維持課	66	草野水のみち鋼矢板護岸塗装工事	千葉市稲毛区園生町地内	16,797,900	H24. 12. 14 H25. 3. 18
		67	人孔蓋更新工事（24-1工区）	千葉市稲毛区小仲台6丁目地内外	14,679,000	H24. 12. 27 H25. 3. 18
下水道管理部 小計				2件	31,476,900	
下水道建設部	下水道建設課	68	下水道排水施設工事（中央20-1工区）に伴う附帯工事	千葉市中央区中央1丁目地内外8	238,770,000 291,069,450	H24. 3. 6 H24. 6. 3 H24. 10. 31
		69	下水道排水施設工事（小仲台23-1工区）	千葉市稲毛区小仲台4丁目地内	291,900,000 301,550,550	H24. 3. 22 H25. 1. 25 H25. 7. 20
		70	下水道排水施設工事（松波24-1工区）	千葉市中央区松波1丁目地内外1	227,566,500 246,598,800	H24. 8. 23 H25. 3. 18 H25. 6. 28
		71	舗装復旧工事（平山24-1）	千葉市緑区平山町地内外2	10,805,550	H24. 8. 25 H24. 12. 2
		72	下水道排水施設工事（大草24-1工区）	千葉市若葉区大草町地内外1	63,000,000 70,892,850	H24. 9. 4 H25. 3. 2 H25. 3. 25
		73	下水道排水施設工事（神明24-1工区）	千葉市中央区神明町地内	76,650,000 85,769,250	H24. 10. 12 H25. 3. 18 H25. 7. 31
		74	下水道排水施設工事（南生実24-1工区）	千葉市中央区南生実町地内外2	18,707,850 20,633,550	H24. 10. 17 H25. 2. 13 H25. 3. 25
		75	マンホールトイレ設置工事（24-1工区）	千葉市美浜区幕張西2丁目地内外3	5,736,150 5,949,300	H24. 11. 2 H25. 1. 30
	76	下水道排水施設工事（亀井24-2工区）	千葉市中央区亀井町地内外1	59,696,700 60,139,800	H24. 11. 13 H25. 3. 12 H25. 4. 30	
	下水道再整備課	77	下水道施設改良工事（長洲23-2工区）	千葉市中央区長洲2丁目地内外1	82,908,000 85,055,250	H24. 1. 24 H24. 3. 13 H24. 8. 31
		78	舗装復旧工事（寒川24-1）	千葉市中央区寒川町3丁目地内	5,935,650	H24. 7. 14 H24. 9. 11
		79	下水道施設改良工事（緑町24-1工区）	千葉市稲毛区緑町1丁目地内外1	73,500,000 73,843,350	H24. 8. 22 H25. 3. 12
80		下水道施設改良工事（本町24-3工区）	千葉市中央区本町2丁目地内外2	79,275,000 81,980,850	H24. 11. 9 H25. 3. 12	

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後)
下水道建設部	下水道再整備課	81	下水道施設改良工事（黒砂 2 4 - 2 工区）	千葉市稲毛区黒砂 1 丁目地内外 1	76,335,000 76,762,350	H24. 8.25 H25. 3.12
		82	下水道施設改良工事（長洲 2 4 - 1 工区）	千葉市中央区長洲 2 丁目地内	19,110,000 19,825,050	H24. 8.25 H24.12.22
		83	下水道施設改良工事（黒砂 2 4 - 1 工区）	千葉市稲毛区黒砂 2 丁目地内	76,112,400	H24. 8.25 H25. 2.10
		84	下水道施設改良工事（椿森 2 4 - 2 工区）	千葉市中央区椿森 1 丁目地内外 4	170,100,000 173,416,950	H25. 1.24 H25. 9.20 H25.10.31
	下水道施設建設課	85	南部浄化センターC系水処理電気設備工事	千葉市中央区村田町 8 9 3 番地内	1,035,861,750 1,029,586,950	H23.11.11 H25. 3.12
		86	南部浄化センターC系水処理機械設備工事	千葉市中央区村田町 8 9 3 番地内	1,971,480,000	H23.11.29 H25. 3.12
		87	南部浄化センター消化ガス機械設備工事	千葉市中央区村田町 8 9 3 番地内	807,077,250	H23.11.29 H25. 3.12
		88	中央浄化センター最終沈殿池採泥機 4・5号機械設備更新工事	千葉市美浜区新港 6 9 番地	217,350,000	H24. 7.11 H25. 3.12
		89	寒川雨水ポンプ場遠方監視制御装置更新工事	千葉市中央区寒川町 3 丁目 1 0 7 番 9 号	103,530,000	H24. 7.11 H25. 3.12
		90	南部浄化センターC系導水渠建設工事	千葉市中央区村田町 8 9 3 番地内	77,700,000 95,454,450	H24. 7.21 H24.12.17 H25. 3.22
		91	南部浄化センター消化ガス電気設備工事	千葉市中央区村田町 8 9 3 番地内	174,300,000	H24. 7.27 H25. 3.12
		92	都ポンプ場電気設備更新工事	千葉市中央区都町 3 丁目 2 4 番 1 7 号	151,200,000	H24. 9. 4 H25. 3.12
		93	幸ポンプ場沈砂池搬送設備更新工事	千葉市美浜区幸町 2 丁目 4 番 1 号	38,850,000	H24. 9.25 H25. 3.12
		94	南部浄化センター場内整備工事	千葉市中央区村田町 8 9 3 番地内	39,501,000	H24.12. 7 H25. 3.12
	都市河川課	95	一級河川勝田川河道築造工事（2 3 - 3 工区）	千葉市花見川区み春野 3 丁目地内外 2	45,885,000	H24. 1.27 H24. 3.18 H24. 9.28
		96	二級河川坂月川河道築造工事（2 4 - 1 工区）	千葉市若葉区加曾利町地内外 1	67,200,000 68,654,250	H24. 8.29 H25. 3.18
		97	排水施設新設工事（宇那谷調整池 2 4 - 1 工区）	千葉市花見川区宇那谷町地内	40,950,000 46,320,750	H24. 8.31 H25. 3.18 H25. 3.25
		98	排水施設新設工事（高田排水路東部支線 2 4 - 1 工区）	千葉市緑区高田町地内	38,850,000 39,292,050	H24. 9.11 H25. 3.18
		99	急傾斜地崩壊防止工事（五十土町 2 4 - 1 工区）	千葉市若葉区五十土町地内	12,854,100 13,194,300	H24.10.20 H25. 3.18
下水道建設部 小計				3 2 件	6,398,697,900	
建設局				9 9 件	8,721,947,850	

水道局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	工 期 (上段：自 中段：至 下段：変更後)
1	水道	100	配水管布設工事 (24-1工区)	千葉県若葉区大広町地内外 1	65,100,000	H24. 9. 6 H25. 3. 18
水道局				1 件	65,100,000	

※ 水道：水道事業事務所

別表

監査実施業務委託一覧表

建設局

部名	課名	番号	委託名	委託箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	期間 上段：自 中段：至 下段：変更後	
土木部	中央・美浜土木	1	高磯一の橋外4補修設計業務委託	千葉市美浜区高洲3丁目地内外	5,318,250	H24. 7. 3 H24. 10. 30	
		2	今井陸橋耐震補強実施設計業務委託	千葉市中央区今井3丁目地内外3	11,022,900 12,018,300	H24. 7. 25 H24. 10. 22 H24. 12. 28	
		3	磯辺真砂線外道路実施設計業務委託	千葉市美浜区真砂4丁目地内外	3,290,700	H24. 7. 26 H24. 9. 23	
	花見川・稲毛土木	4	鉄砲塚跨線橋耐震補強実施設計業務委託	千葉市花見川区幕張本郷6丁目地内外1	7,741,650 8,004,150	H24. 6. 21 H24. 12. 17	
		5	幕張本郷35号線外特定経路実施設計業務委託	千葉市花見川区幕張本郷2丁目地内外	1,587,600 2,000,250	H24. 7. 3 H24. 9. 30	
		6	柏井町33号線外9道路実施設計業務委託	千葉市花見川区柏井町800地先外4	1,776,600 1,989,750	H24. 12. 15 H25. 3. 18	
	若葉	緑土木事務所	7	千城橋耐震補強詳細設計業務委託	千葉市若葉区千城台南1丁目地内外1	3,612,000	H24. 9. 28 H24. 12. 6
			8	誉橋耐震補強設計業務委託	千葉市緑区誉田町1丁目地内	2,649,150	H24. 3. 22 H24. 8. 18
			9	誉田歩道橋補修設計業務委託	千葉市緑区誉田町2丁目地内外1	4,683,000	H24. 6. 28 H24. 11. 24 H25. 2. 28
			10	(主)千葉大網線(大木戸新田交差点)交差点詳細設計業務委託	千葉市緑区大高町地内外1	1,916,250	H24. 7. 10 H25. 1. 5 H25. 3. 21
土木部 小計				10件	43,598,100		
道路部	道路建設課	11	誉田駅北口線道路実施設計業務委託	千葉市緑区誉田町2丁目地内	4,171,650 5,531,400	H24. 6. 26 H25. 1. 21	
		12	千葉市立真砂東小学校グラウンド改修実施設計業務委託	千葉市美浜区真砂2丁目13番1号	909,300 1,160,250	H24. 8. 9 H24. 11. 6 H24. 12. 6	
		13	(主)穴川天戸線(亥鼻橋)地質調査業務委託	千葉市花見川区畑町地内外2	7,129,500 8,519,700	H25. 1. 19 H25. 5. 18	
	街路建設課	14	新港横戸町線緑地A(仮称)外1緑道実施設計業務委託	千葉市稲毛区黒砂3丁目地内外	6,667,500	H24. 7. 28 H24. 10. 25	
		15	新港横戸町線黒砂F公園(仮称)擁壁設計業務委託	千葉市稲毛区黒砂4丁目地内	2,268,000 3,441,900	H24. 8. 25 H24. 11. 22 H24. 12. 22	
		16	黒砂橋交差点実施設計業務委託	千葉市美浜区幸町2丁目地内外	1,182,300 1,351,350	H24. 10. 20 H25. 3. 25	
道路部 小計				6件	22,328,250		
下管理	下維持	17	下水道実施設計業務委託(椿森24-2)	千葉市中央区椿森1丁目地内外2	4,897,200	H24. 12. 21 H25. 3. 22	
下水道管理部 小計				1件	4,897,200		

※ 中央・美浜土木:中央・美浜土木事務所 花見川・稲毛土木:花見川・稲毛土木事務所 若葉:若葉土木事務所
下管理:下水道管理部 下維持:下水道維持課

建設局

部名	課名	番号	委託名	委託箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	期間 上段：自 中段：至 下段：変更後
下水道建設部	下水道建設課	18	合流式下水道改善施設実施設計業務委託 (栄24-1)	千葉市中央区栄町地内外7	17,745,000	H24. 6. 7 H24. 11. 3
		19	下水道実施設計業務委託(稲毛24-1)	千葉市稲毛区稲毛2丁目地内外2	5,153,400 5,336,100	H24. 10. 5 H25. 1. 22 H25. 3. 18
		20	土質調査業務委託(神明24-1)	千葉市中央区神明町地内外2	2,940,000	H24. 10. 26 H25. 1. 8
		21	下水道実施設計業務委託(轟24-1)	千葉市稲毛区轟町2丁目地内外1	3,622,500	H24. 11. 27 H25. 3. 15
	下水道再整備課	22	下水道実施設計業務委託(院内24-1)	千葉市中央区院内2丁目地内外4	8,196,300	H24. 9. 21 H25. 3. 9
		23	下水道実施設計業務委託(椿森24-1)	千葉市中央区椿森1丁目地内外4	9,173,850	H24. 9. 22 H25. 2. 18
		24	下水道実施設計業務委託(美浜24-1)	千葉市美浜区美浜地内外7	11,531,100	H24. 12. 8 H25. 3. 15
		25	下水道実施設計業務委託(高浜24-2)	千葉市美浜区高浜7丁目地内外2	6,210,750	H24. 12. 20 H25. 3. 15
	下水道施設	26	下水道実施設計業務委託(院内24-2)	千葉市中央区院内2丁目地内外3	6,995,100	H24. 12. 21 H25. 3. 22
		27	神明ポンプ場外3機械・電気設備更新 実施設計業務委託	千葉市中央区問屋町2丁目20番 外3	8,476,650	H24. 9. 22 H25. 3. 15
	都市河	28	蘇我雨水ポンプ場耐震補強実施設計 業務委託	千葉市中央区蘇我町2丁目 934番地内	14,595,000	H24. 12. 29 H25. 3. 15
		29	急傾斜地崩壊防止施設土質調査業務委託 (宮崎町)	千葉市中央区宮崎町地内	1,816,500	H24. 8. 23 H24. 11. 20
	下水道建設部 小計				13件	96,456,150
建設局				29件	167,279,700	

※ 下水道施設：下水道施設建設課 都市河：都市河川課

水道局

部名	課名	番号	委託名	委託箇所	契約金額(円) (下段：変更後)	期間 上段：自 中段：至 下段：変更後
1	水道	30	送水管布設実施設計業務委託	千葉市緑区平川町地内外1	5,824,350	H24. 12. 5 H25. 3. 25
水道局				1件	5,824,350	

※ 水道：水道事業事務所
