

6 監査報告第7号  
令和6年10月25日

千葉市議会議長 石川 弘 様  
千葉市長 神谷 俊一 様

千葉市監査委員 穴倉 輝雄  
同 宮原 清貴  
同 石橋 毅  
同 亀井 琢磨

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定により監査を実施したので、同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を提出します。



# 第 1 期工事定期監査報告書

## 第 1 対象

経済農政局、建設局及び水道局が令和 5 年度に執行した工事等（工事に伴う設計、監理等の業務委託を含む。）

## 第 2 期間

令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 10 月 23 日まで

## 第 3 重点項目

「施工・検査」を重点項目として、工事等が法令や基準等に基づき、適切に施工・検査されているか重点的に確認を行った。

## 第 4 着眼点

主な着眼点を次のとおり設定した。

項目	着 眼 点
1 設計・積算	工事 (1) 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (2) 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。 (3) 仕様書、図面及び設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。 (4) コスト削減意識を反映した設計となっているか。 (5) 高齢者、障害者等利用者の立場に立った設計となっているか。 (6) 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (7) 歩掛及び単価は適正か。また、諸経費は適切に算出されているか。 (8) 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。  業務委託 (1) 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。 (2) 委託料の積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。 (3) 委託料の積算は適正か。また、算出根拠は明確か。
2 契約	工事・業務委託 (1) 入札の手続きは適正に行われているか。 (2) 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。 また、これらの内容は適正か。 (3) 追加契約あるいは設計変更等による契約変更の場合、その事由及び契約金額の増減の内容は適切か。また、事務は適時、かつ適切に行われているか。 (4) 契約の履行期限は守られているか。また、完了報告の時期は適正か。

3 施 工 ・ 検 査	<b>工事</b> (1) 工事施工計画は適切か。 (2) 設計図書どおり施工されているか。 (3) 法令等を遵守して施工されているか。 (4) 各種承諾図書、工事記録写真等の受注者提出書類は整備されているか。 (5) 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は整備されているか。 (6) 安全管理、工程管理及び品質管理は適切に行われているか。 (7) 環境に配慮した施工がなされているか。
	<b>業務委託</b> (1) 委託成果品の検査及び委託業務の履行確認は適切に行われているか。

※上記以外については、全国都市監査委員会の定めた「監査等の着眼点」を参考とする。

## 第5 主な実施内容

監査は、千葉市監査基準に基づき実施した。

監査に当たっては、監査対象工事338件のうちから抽出した別表1に掲げる監査実施工事80件、監査対象業務委託94件のうちから抽出した別表2に掲げる監査実施業務委託20件について、設計図書、契約書、施工管理関係書類等の調査、関係職員からの説明聴取及び実地調査により行った。

局別の監査実施状況

区 分	工事		業務委託	
	監査対象 件数	監査実施 件数	監査対象 件数	監査実施 件数
経済農政局	3	2	1	1
建設局	329	75	92	19
水道局	6	3	1	0
合 計	338	80	94	20

## 第6 日程

日 付	内 容	
令和6年 2月 1日	監査実施通知	
令和6年 4月 26日	概況説明の聴取	令和6年度第 1回監査委員会議
令和6年 5月 22日	現場監査	令和6年度第 2回監査委員会議
令和6年10月15日	復命	令和6年度第12回監査委員会議

## 第7 監査の結果

前記のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった工事等は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善及び検討の必要があるものが認められた。

なお、以下において「指摘」とは、不適切な事案に対し、是正、改善等の措置を求めるもの、「意見」とは、事案に対する見解を示したものである。

# 1 設計・積算

## (1) 積算について改善すべき事項

ア 見積り単価※を用いた積算を適正に行うべきもの

[建設局：桜木町小倉町線下ボックスカルバート補修工事（若5-1）  
高田排水路浚渫工事（4-1）]

### (ア) 事案及び問題点

土木工事標準積算基準によると、請負工事費は、工事価格と消費税等相当額で構成されており、消費税等相当額は工事価格に税率を乗じて得た額であることから、工事価格には消費税等相当額を含まないものとされている。

しかしながら、当該工事においては、工事価格の算出にあたり採用した見積り単価に、消費税等相当額が含まれたものが見受けられた。

これは、積算のため徴収した見積りに消費税等相当額が含まれているか等の内容の確認不足及びチェック体制の不備があったものと考えられる。

### (イ) 指摘

見積り単価を用いた積算については、土木工事標準積算基準に基づき適正に行われたい。

(参考)


#### ※見積り単価

設定された単価がない場合に、徴収した見積りにより決定する単価

### 土木工事標準積算基準 抜粋

#### 第1章総則 ②請負工事の工事費構成 1 工事費の基本構成

##### (1) 一般土木



## 2 契約

### (1) 契約について改善すべき事項

ア インフレスライド条項の適用にあたり出来高確認を徹底すべきもの

[建設局：櫛橋町13号線外2舗装改良工事（花4-1）

水道局：配水管布設工事（北谷津4-2）]

#### (ア) 事案及び問題点

「賃金等の変動に対する工事請負契約約款第26条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）」によると、インフレスライド条項を適用する場合は、受注者へ基準日における工事出来高内訳書または実施工程表付き工事履行報告書等の書類提出を求め、出来高数量を確認することとされている。

しかしながら、当該工事においては、インフレスライド条項を適用しているにもかかわらず、出来高数量を確認できる書類が提出されていないものが見受けられた。

これは、基準日において現場の施工が未着手であったことから、出来高数量の確認書類は提出不要と誤認したためと考えられる。

#### (イ) 指摘

インフレスライド条項の適用にあたっては、受注者からの提出書類による出来高確認を徹底されたい。

#### (参考)

インフレスライド条項 工事請負契約約款第26条第6項

予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不相当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
---

### 3 施工・検査

#### (1) 施工について改善すべき事項

##### ア 玉掛け作業を適正に行うよう指導すべきもの

[建設局：二級河川支川都川地盤改良工事（3-1）]

##### (ア) 事案及び問題点

土木工事安全施工技術指針によると、玉掛け作業を行う場合、フックは吊り荷の重心に誘導し、吊り角度と水平面とのなす角度は60度以内とすることとされている。

しかしながら、当該工事における、玉掛け作業の施工状況を工事写真で確認したところ、フックが吊り荷の重心からずれ、吊り角度が60度を超えているものが見受けられた。


これは、玉掛け作業の安全な施工に対する意識不足によるものと考えられる。

##### (イ) 指摘

玉掛け作業が、土木工事安全施工技術指針を遵守し適正に行われるよう、受注者に対して指導されたい。

(参考)

玉掛け作業における吊り角度

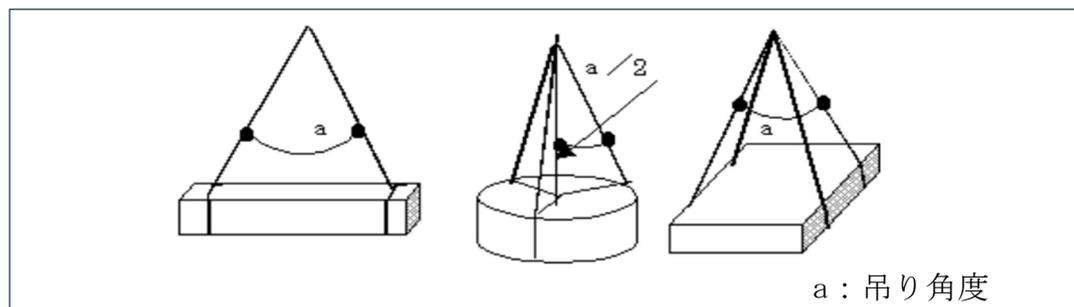

出典：玉掛け作業の安全に係るガイドライン

施工状況写真



(2) 施工について検討すべき事項

ア 書面による報告を徹底する手法の検討を求めるもの

[土木工事全般]

(ア) 事案及び問題点

土木工事安全施工技術指針によると、土木工事における施工の安全を確保するため、架空線等上空施設を施工に先立ち現地調査することとされている。また、土木工事共通仕様書においては、受注者は現地調査の結果について、支障物件の有無に関わらず監督職員へ書面により報告することとされている。

しかしながら、監査対象工事の提出書類を確認したところ、現地調査は行われているものの、書面による報告が確認できないものが見受けられた。

(イ) 意見

工事事故を未然に防止し、施工の安全を確保するため、書面による報告を徹底する手法を検討されたい。

(参考)

千葉県土木工事共通仕様書 抜粋

1-1-2 用語の定義

20. 報告

報告とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。

1-1-27 工事中の安全確保

6. 架空線等事故防止対策

受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査（場所、種類、高さ等）を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わらず、監督職員へ報告しなければならない。

## 別表 1

## 監査実施工事一覧表

## 経済農政局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円)		工 期	
					上段：当初 下段：変更後		上段：自 中段：至 下段：変更後	
農政部	農政課	1	富田さとにわ耕園見晴台設置工事(5-1)	千葉市若葉区富田町地内	13,928,200		R 5.10.24 R 6. 2.29	
		2	道路整備工事(椎名崎町5-1)	千葉市緑区椎名崎町地内	12,816,100 16,183,200		R 5. 7.14 R 5.10.21	
経済農政局				2件	26,744,300			

## 建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円)		工 期	
					上段：当初 下段：変更後		上段：自 中段：至 下段：変更後	
土木部	土木保全課	3	本村橋外2補修工事(4-2)	千葉市花見川区畑町地内外1	150,700,000		R 4.10.27 R 5. 3.25	
					215,418,500		R 5.10.31	
		4	三角町柏井町線(柏井橋)護岸工事(4-1)	千葉市花見川区柏井町地内	146,850,000		R 4.10.21 R 5. 3.25	
					199,345,300		R 5. 8.31	
		5	森池橋外1補修工事(4-1)	千葉市中央区大森町地内外	89,026,300		R 5. 3.28 R 5.11. 2	
					113,333,000		R 5.11.24	
	6	海浜橋(上り線)補修工事(5-1)	千葉市美浜区新港地内	62,425,000		R 5.10.17 R 6. 2.28		
	中央・美浜土木事務所	7	(主)千葉大網線(青葉町地区)電線共同溝整備工事(中4-1)	千葉市中央区青葉町地内外1	196,900,000		R 4. 7.14 R 5. 3.11	
					240,065,100		R 5. 8.31	
		8	千葉臨海線舗装改良工事(美5-1)	千葉市美浜区打瀬3丁目地内外1	134,392,500		R 5. 6.30 R 5.12.26	
					136,390,100			
		9	磯辺畑町線外1舗装改良工事(美5-1)	千葉市美浜区真砂5丁目地内外4	60,084,200		R 5. 6.22 R 5.11.28	
					62,841,900			
10		都町140号線外5舗装改良工事(中4-1)	千葉市中央区都町4丁目地内外3	46,786,300		R 5. 2. 3 R 5. 8. 8		
	47,399,000							
11	道路照明灯補修工事(中4-2)	千葉市中央区新宿1丁目地内	18,425,000		R 5. 4. 7 R 5. 9.23			
			18,916,700					
12	安全施設等設置工事(中5-4)	千葉市中央区・美浜区管内	14,912,700		R 5.10.28 R 6. 2.24			
			16,458,200					
花稲	13	磯辺畑町線外1舗装改良工事(花5-1)	千葉市花見川区検見川町3丁目地内外2	74,836,300		R 5.11. 3 R 6. 3.11		

※ 花稲：花見川・稲毛土木事務所

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円)		工 期	
					上段：当初 下段：変更後	上段：自 中段：至 下段：変更後		
土木部	花見川・ 稲毛土木事務所	14	稲毛122号線外1舗装改良工事(稲4-1)	千葉市稲毛区小仲台8丁目地内外1	62,066,400		R 5. 2. 3 R 5.10. 7 R 6. 2.29	
		15	犢橋町13号線外2舗装改良工事(花4-1)	千葉市花見川区花見川地内外6	43,920,800		R 5. 2. 3 R 5. 8. 8	
		16	安全施設等設置工事(花5-1)	千葉市花見川区犢橋町地内外	48,790,500		R 5.10.18 R 6. 2.24	
					38,316,300		R 6. 2.19	
		17	園生町103号線外4舗装道補修工事(稲5-1)	千葉市稲毛区園生町地内外6	29,516,300		R 5.10.28 R 6. 3. 5	
	18	犢橋町13号線歩道整備工事(花5-1)	千葉市花見川区花見川地内	23,168,200		R 5. 9. 9		
				23,404,700		R 6. 1.16		
	若葉土木事務所	19	(主) 浜野四街道長沼線外1舗装改良工事(若4-1)	千葉市若葉区谷当町地内外	45,643,400		R 5. 2. 3 R 5. 7.29	
					46,554,200			
		20	誉田町野呂町線外2舗装道補修工事(若5-1)	千葉市若葉区野呂町地内外2	30,966,100		R 5.11.18 R 6. 3.11	
		21	桜木町小倉町線下ボックスカルバート外1補修工事(若5-1)	千葉市若葉区小倉町地内外2	27,990,600		R 5.10.31 R 6. 3.11	
		22	モノレール千城台駅バスシェルター改修工事(若5-1)	千葉市若葉区千城台北3丁目21番地内	20,108,000		R 5.11.14 R 6. 3.18	
	23	西都賀52号線外1側溝改良工事(若5-1)	千葉市若葉区西都賀1丁目地内外1	16,523,100		R 5.10.28 R 6. 3.11		
	緑土木事務所	24	(主) 千葉茂原線舗装改良工事(緑5-1)	千葉市緑区古市場町地内	39,842,000		R 6. 2. 1 R 6. 5.21	
		25	(主) 千葉大網線(土気跨線橋)道路築造工事(緑4-1)	千葉市緑区土気町地内	33,435,600		R 4. 9.17 R 5. 3.18	
					105,110,500		R 5. 5. 8	
		26	(主) 千葉大網線外舗装道補修工事(緑5-1)	千葉市緑区大高町地内外1	23,511,400		R 5.10.17 R 6. 1.14	
	28,660,500							
	27	JR鎌取駅南口駅前広場シェルター改修工事(緑5-1)	千葉市緑区おゆみ野3丁目地内	17,545,000		R 5. 9.16 R 6. 3. 3		
	28	(一) 誉田停車場中野線舗装改良工事(緑5-2)	千葉市緑区平川町地内	16,487,900		R 5.12. 2 R 6. 2.29		
	土木部 小計				26件	1,455,822,500		
	道路部	道建	29	千葉市地方卸売市場雨水管改修工事(5-1)	千葉市美浜区高浜2丁目2番1号	154,096,800		R 5. 7.21
						155,537,800		R 6. 3.11

※ 道建：道路建設課

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円)		工 期	
					上段：当初 下段：変更後		上段：自 中段：至 下段：変更後	
道路部	道路建設課	30	(仮称) 幕張西スポーツ広場整備外構工事(5-1)	千葉市美浜区幕張西6-1-3	143,737,000		R 5. 8. 3 R 6. 2. 28	
		31	千葉競輪場第一駐車場改修工事(5-1)	千葉市中央区弁天4丁目地内	127,710,000		R 5. 7. 21 R 6. 2. 25	
		32	(主) 千葉川上八街線外1歩道整備工事(5-1)	千葉市若葉区大草町地内外1	109,560,000		R 5. 12. 21 R 6. 3. 11	
		33	新港1号線歩道整備工事(5-1)	千葉市美浜区新港地内	88,737,000		R 5. 11. 15 R 6. 3. 11	
		34	若松町金親町線(金親町地区)道路改良工事(4-1)	千葉市若葉区金親町地内	39,953,100		R 5. 5. 12 R 5. 9. 8 R 6. 3. 11	
	街路建設課	35	(都) 塩田町誉田町線(塩田町地区)橋梁下部工工事(4-2)	千葉市中央区塩田町地内	95,150,000		R 5. 5. 11 R 6. 2. 4	
		36	幕張369号線道路改良工事(4-1)	千葉市花見川区幕張町3丁目地内	118,207,100 63,800,000		R 4. 10. 28 R 5. 3. 11 R 6. 3. 18	
		37	(都) 村田町線街路築造工事(5-1)	千葉市中央区村田町地内	25,727,900 28,439,400		R 5. 8. 5 R 6. 1. 21	
		38	(都) 誉田駅前線道路拡幅工事(5-1)	千葉市緑区誉田町3丁目地内外	4,760,800 8,446,900		R 5. 7. 15 R 5. 11. 11 R 5. 11. 30	
	道路部 小計				10件	853,232,600		
	下水道企画部	総合治水課	39	二級河川支川都川地盤改良工事(3-1)	千葉市若葉区大宮町地内外1	413,355,800 437,818,700		R 4. 6. 25 R 5. 2. 19 R 5. 6. 29
			40	二級河川坂月川浚渫工事(4-2)	千葉市若葉区坂月町地内外2	172,799,000		R 5. 3. 23 R 5. 12. 27
			41	急傾斜地崩壊防止工事(宮崎町5-1)	千葉市中央区宮崎町地内	54,780,000		R 5. 7. 26 R 6. 2. 20 R 6. 3. 11
			42	急傾斜地崩壊防止工事(下大和田町4-1)	千葉市緑区下大和田町地内	31,900,000 67,845,800		R 5. 3. 28 R 5. 7. 25 R 6. 1. 9
下水道企画部 小計				4件	672,834,800			
下水道施設部	下水道整備課	43	下水道施設改良工事(検見川5-1)	千葉市花見川区検見川町1丁目地内	239,800,000		R 5. 7. 13 R 5. 12. 29 R 6. 3. 31	
		44	下水道施設改良工事(亀井町5-1)	千葉市中央区亀井町地内外	213,400,000		R 5. 9. 14 R 6. 3. 4 R 6. 5. 31	

建設局

部 名	課 名	番 号	工 事 名	工 事 箇 所	契約金額(円)		工 期	
					上段：当初 下段：変更後		上段：自 中段：至 下段：変更後	
下水道 施設部	下水道 整備課	45	野呂地区管路施設築造工事	千葉市若葉区野呂町地内	183,700,000		R 5. 8. 24 R 6. 3. 11	
		46	人孔蓋更新工事（5-1）	千葉市若葉区桜木6丁目地内外	139,954,100		R 5. 10. 24 R 6. 3. 11	
		47	下水道施設改良工事（みつわ台5-3）	千葉市若葉区みつわ台1丁目地内外	136,006,200 137,223,900		R 5. 6. 2 R 5. 11. 28	
		48	下水道施設改良工事（貝塚5-1）	千葉市若葉区貝塚町地内外	129,888,000		R 5. 8. 25 R 6. 3. 4	
		49	下水道施設改良工事（宮崎4-2）	千葉市中央区宮崎2丁目地内外	109,026,500		R 4. 9. 6 R 5. 3. 11 R 5. 4. 28	
		50	下水道施設改良工事（中田5-1）	千葉市若葉区中田町地内外	91,998,500		R 5. 9. 8 R 6. 3. 11	
		51	下水道施設改良工事（小仲台5-1）	千葉市稲毛区小仲台2丁目地内外	60,280,000 62,151,100		R 5. 8. 11 R 6. 1. 7	
		52	下水道排水施設工事（出洲港5-1）	千葉市中央区出洲港地内	33,000,000		R 5. 12. 16 R 6. 6. 2	
		53	下水道排水施設工事（蘇我5-1）	千葉市中央区蘇我5丁目地内	29,095,000		R 6. 2. 10 R 6. 7. 8 -	
		54	野呂地区中継ポンプ電気設備工事	千葉市若葉区野呂町地内	28,600,000		R 4. 11. 18 R 5. 3. 18 R 5. 10. 31	
		55	下水道排水施設工事（若松5-1）	千葉市若葉区若松町地内外	20,188,300 21,859,200		R 5. 8. 26 R 6. 1. 22	
		56	下水道排水施設工事（塩田5-1）	千葉市中央区塩田町地内	13,085,600 18,119,200		R 5. 8. 1 R 5. 12. 8 R 6. 1. 31	
	57	舗装復旧工事（佐和町5-1）	千葉市若葉区佐和町地内外	11,645,700		R 5. 11. 16 R 6. 3. 11		
	雨水 対策課	58	下水道排水施設工事（みつわ台雨水2-1）	千葉市若葉区みつわ台3丁目地内	1,207,947,400 1,481,833,100		R 3. 9. 11 R 5. 3. 4 R 6. 2. 29	
		59	下水道排水施設工事（弁天雨水3-1）	千葉市中央区弁天4丁目地内外1	427,111,300 473,325,600		R 4. 5. 19 R 5. 1. 13 R 5. 10. 31	
		60	下水道排水施設工事（千城台南雨水3-1）	千葉市若葉区千城台南4丁目地内外1	214,390,000 278,394,600		R 4. 3. 31 R 4. 11. 25 R 5. 7. 31	
		61	下水道排水施設工事（千城台南雨水4-1）	千葉市若葉区千城台南4丁目地内外1	181,760,700		R 5. 7. 15 R 6. 3. 11	

建設局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円)		工 期	
					上段：当初 下段：変更後		上段：自 中段：至 下段：変更後	
下水道施設部	雨水対策課	62	排水施設新設工事（宇那谷2号排水路5-1）	千葉市花見川区宇那谷町地内外1	60,057,800		R 5.10.24 R 6. 3.11	
		63	下水道排水施設工事（稲毛海岸雨水5-1）	千葉市美浜区稲毛海岸1丁目地内	56,257,300		R 5.10.24 R 6. 3.11	
	下水道維持課	64	高田排水路浚渫工事（4-1）	千葉市若葉区高根町地内外	226,446,000		R 5. 3. 8 R 5. 8. 4	
		65	都市下水路塗装工事（六方都市下水路4-1）	千葉市稲毛区作草部町地内外	45,778,700		R 5. 3. 9 R 5. 9. 4	
		66	下水道施設塗装工事（草野雨水2号幹線5-1）	千葉市花見川区宮野木台1丁目地内	38,600,100		R 5. 3. 2 R 5. 7.29	
		67	浜田橋雨水ポンプ場自家発電設備改築工事（4-1）	千葉市花見川区幕張町1丁目地内	23,608,200		R 5. 4. 4 R 6. 2.27	
		68	下水道施設改修工事（草野雨水1号幹線外5-1）	千葉市稲毛区園生町地内外2	20,790,000		R 5.12. 2 R 6. 3.10	
	下水道施設建設課	69	南部浄化センター重力濃縮機械設備改築工事	千葉市中央区村田町893番地内	284,680,000		R 4. 9. 1 R 5. 3.18	
					300,591,500		R 6. 3.10	
		70	南部浄化センター重力濃縮電気設備改築工事	千葉市中央区村田町893番地内	245,080,000		R 4. 7. 8 R 5. 3.10	
					248,492,200		R 6. 3.10	
		71	中央浄化センター水処理施設防食工事（4-2）	千葉市美浜区新港69番地	232,815,000		R 4.12. 2 R 5. 8.28	
					236,205,200		R 5.11.30	
		72	南部浄化センターA系水処理監視制御設備改築工事	千葉市中央区浜野町1025番地内	224,400,000		R 4. 6.17 R 5. 3.13 R 6. 3.13	
		73	蘇我雨水ポンプ場主ポンプ機械設備改築工事	千葉市中央区蘇我町2丁目934番地14	165,000,000		R 4. 7.30 R 5. 3.18 R 5. 8.31	
74	若葉ポンプ場受変電設備改築工事	千葉市美浜区若葉1丁目110番地	94,600,000		R 4.11.12 R 5. 8. 8			
75	中央浄化センター返送汚泥ポンプ槽建設工事	千葉市美浜区新港69番地	83,600,000		R 5. 9. 8 R 6. 4.14			
76	小規模ポンプ場機械設備改築工事	千葉市若葉区大宮町518番11号地先外	58,300,000		R 4. 6.24 R 5. 1.19 R 6. 1.31			
77	中央浄化センター建築機械設備改築工事	千葉市美浜区新港69番地	22,000,000		R 5. 3. 2 R 5.12.26			
下水道施設部 小計				35件	5,352,890,400			
建設局				75件	8,334,780,300			

水道局

部名	課名	番号	工 事 名	工事箇所	契約金額(円)		工 期	
					上段：当初 下段：変更後		上段：自 中段：至 下段：変更後	
-	水道事業事務所	78	配水管布設工事（北谷津4－2）	千葉県若葉区北谷津町地内外	141,900,000		R 5. 5.11	
					147,458,300		R 6. 2. 4	
								R 6. 3.11
		79	平川浄水場電気機械設備改築工事	千葉県緑区平川町2210番地	123,200,000		R 5. 9.12	
							R 6. 3.18	
		80	配水管更新工事（高津戸4－1）	千葉県緑区高津戸町地内	104,874,000		R 5. 4.18	
					119,871,400		R 5.11. 3	
							R 6. 1.10	
水道局				3 件	369,974,000			

## 別表 2

## 監査実施業務委託一覧表

## 経済農政局

部名	課名	番号	委託名	委託箇所	契約金額(円) 上段：当初 下段：変更後	工期 上段：自 中段：至 下段：変更後
農政部	農政課	1	農業用施設実施設計業務委託（災害復旧）5-1	千葉市若葉区谷当町地内外	3,911,600	R 5.12. 7 R 6. 3. 5
経済農政局				1件	3,911,600	

## 建設局

部名	課名	番号	委託名	委託箇所	契約金額(円) 上段：当初 下段：変更後	工期 上段：自 中段：至 下段：変更後
土木部	土保	2	美浜大橋（下り線）外3補修設計業務委託（4-1）	千葉市美浜区磯辺8丁目地内外	23,430,000 25,386,900	R 5. 3. 28 R 5.10.13 R 5.12.13
	中美	3	J R 蘇我駅自由通路補修設計業務委託（中4-1）	千葉市中央区今井2丁目地内外1	9,240,000	R 4. 8.17 R 5. 2.12 R 5. 6.30
		4	赤井町60号線外1道路実施設計業務委託（中5-1）	千葉市中央区赤井町地内外1	2,939,200	R 5. 7. 8 R 5.12. 4 R 6. 2. 2
	花稻	5	幕張本郷駅自由通路補修設計業務委託（花5-1）	千葉市花見川区幕張本郷1丁目地内	8,580,000	R 5. 5.30 R 6. 1.24 R 6. 3.22
	若葉	6	小倉台41号線外6道路実施設計業務委託（若5-1）	千葉市若葉区小倉台4丁目地内外5	3,711,400	R 5.10. 1 R 6. 3. 4
	緑	7	おゆみ野東南部4号線外1道路実施設計業務委託（緑5-1）	千葉市緑区おゆみ野2丁目地内外2	6,688,000	R 5.12. 2 R 6. 3.22
	土木部 小計				6件	54,588,600
道路部	道路計画課	8	大日町入口交差点外2交差点詳細設計業務委託（5-1）	千葉市花見川区大日町地内外2	9,192,700	R 5. 6. 3 R 6. 3. 8
		9	愛生町4号線（六方調整池）地質調査業務委託（5-1）	千葉市若葉区愛生町地内	1,810,600	R 5. 6. 3 R 5. 8. 1
	道路建設課	10	磯辺真砂線外5自転車走行環境設計業務委託（5-1）	千葉市美浜区磯辺5丁目地内外	17,444,900 21,280,600	R 5. 7.25 R 6. 1.20 R 6. 2.28
		11	幕張町弁天町線外6自転車走行環境設計業務委託（5-1）	千葉市花見川区幕張本郷5丁目地内外	15,202,000	R 5. 9.26 R 6. 2.22

※ 土保：土木保全課、中美：中央・美浜土木事務所、花稻：花見川・稲毛土木事務所、若葉：若葉土木事務所、緑：緑土木事務所

## 建設局

部 名	課 名	番 号	委 託 名	委 託 箇 所	契 約 金 額 (円)		工 期	
					上 段 : 当 初 下 段 : 変 更 後		上 段 : 自 中 段 : 至 下 段 : 変 更 後	
道 路 部	街 建	12	(都) 誉田駅前線土質調査業務委託(5-1)	千葉市緑区誉田町2丁目地内	7,651,600		R 5.11.18 R 6. 3. 6	
道路部 小計				5 件	51,301,800			
下 企	総 治	13	二級河川支川都川樋管実施設計業務委託(4-1)	千葉市若葉区大宮町地内外3	26,303,200		R 5. 9.16 R 6. 3.22	
下水道企画部 小計				1 件	26,303,200			
下 水 道 施 設 部	下 水 道 整 備 課	14	下水道実施設計業務委託(検見川5-1)	千葉市花見川区検見川町1丁目地内外	20,175,100		R 5. 4.15 R 5.11.10	
		15	更科地区管路・ポンプ施設外実施設計業務委託	千葉市若葉区更科町地内外3	21,392,800		R 6. 1.31	
		16	下水道実施設計業務委託(作草部5-1)	千葉市稲毛区作草部町地内外	23,650,000		R 5.12. 2 R 6. 3.22	
	雨 水 対 策 課	17	下水道実施設計業務委託(弁天雨水3-1)	千葉市中央区弁天3丁目地内	16,996,100		R 5. 4.14 R 5. 9.30	
		18	土質調査業務委託(草野雨水4-1)	千葉市稲毛区小仲台7丁目地内外6	22,310,200		R 4. 2.11 R 4. 8. 9 R 6. 2.29	
		19	下水道実施設計業務委託(古市場雨水外5-1)	千葉市緑区古市場町地内外1	18,845,200		R 4.12.24 R 5. 5.22 R 5. 6. 8	
		20	南部浄化センター機械・電気設備改築実施設計業務委託(5-1)	千葉市中央区村田町893番地内	7,272,100		R 5. 3.28 R 5. 9.13 R 5.11.30	
下水道施設部 小計				7 件	119,794,400			
建設局				19 件	251,988,000			

※ 街建：街路建設課、総治：総合治水課、施建：下水道施設建設課
